




Fachforum NTPDataGO

Datenbasiertes Nachtragsmanagement



21.01.2026 | Berlin

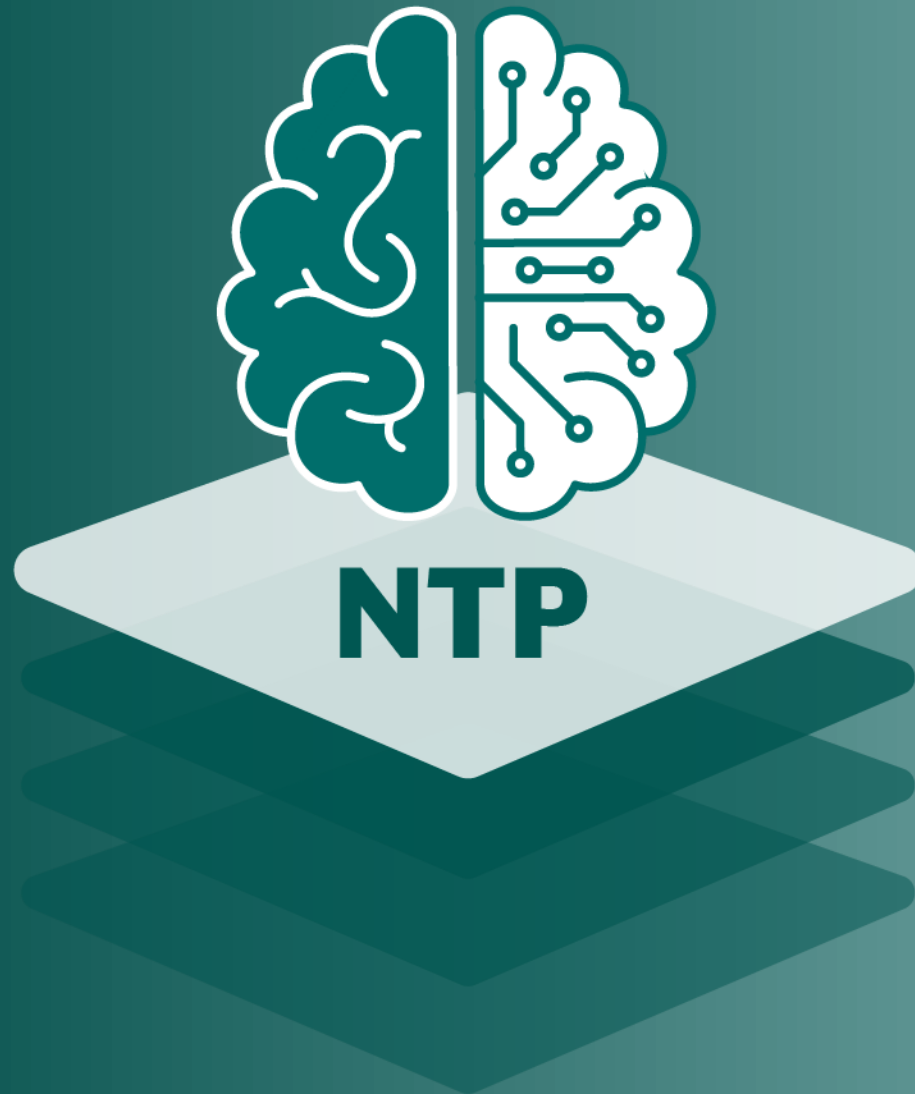

Projektvorstellung 01

Blick in die Nachtragsplattform 02


Austausch & Diskussion 03

Entstehung Projekt NTPDataGO


Spitzengespräch adressiert Auftrag zur weiteren Digitalisierung des NT-Prozesses

Problemfelder in der Nachtragsbearbeitung

Durchlaufzeit für Nachträge liegt nicht im vereinbarten Bereich

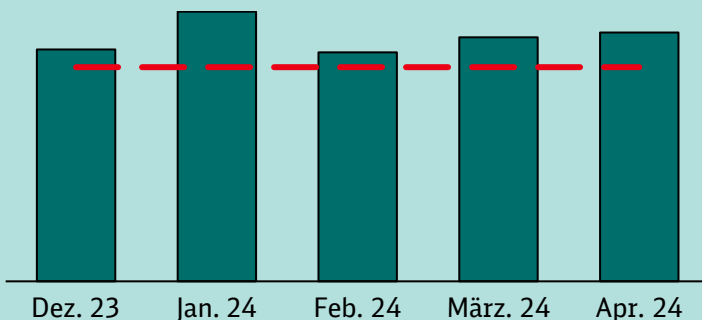

Abweichungen in Qualität, Inhalt und Anforderungen bei der NT-Einreichung

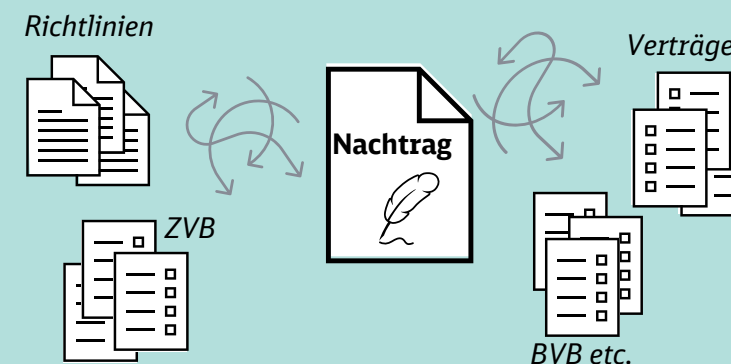

Auftrag Spitzengespräch


- Projektaufsatz zur weiteren Digitalisierung des NT-Prozesses
- Schnittstelle zur Bauwirtschaft ist der Technische Beirat

Nutzen der neuen Nachtragsplattform

Inhalte des Projektes NTPDataGO

Entwicklung neue Nachtragsplattform

Aufnahme von Arch./Ing. Verträgen auf die NTP

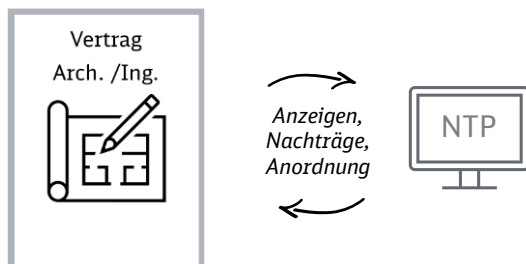

Schriftverkehr zum Nachtragsmanagement bei Arch./ing. Verträgen wird über NTP ausgetauscht

Formularmasken NTP



Auftragnehmer wird bei Einreichung durch Formulare unterstützt (inkl. Pflichtfelder, Hinweiskfelder und Bedingungen)



Nutzen



- Einheitliche Nachtragsqualität durch standardisierte Vorlagen
- Transparenz im Nachtragsmanagement für alle Beteiligten
- Beschleunigung der Nachtragsprüfung

Formulare auf der Nachtragsplattform

Bauverträge



Nachtrag

Nachlieferung zum Nachtrag


Anzeige einer Vertragsabweichung

Mehrkostenanzeige

Behinderungsanzeige

Bedenkenanzeige

Ingenieurverträge



Nachtrag

Nachlieferung zum Nachtrag


Anzeige einer Vertragsabweichung

Termingefährdungsanzeige

Behinderungsanzeige

Bedenkenanzeige

Modulverträge



Nachtrag


Nachlieferung zum Nachtrag

Mehrkostenanzeige


Behinderungsanzeige

Bedenkenanzeige

Projektorganigramm – Einbindung des Technischen Beirats

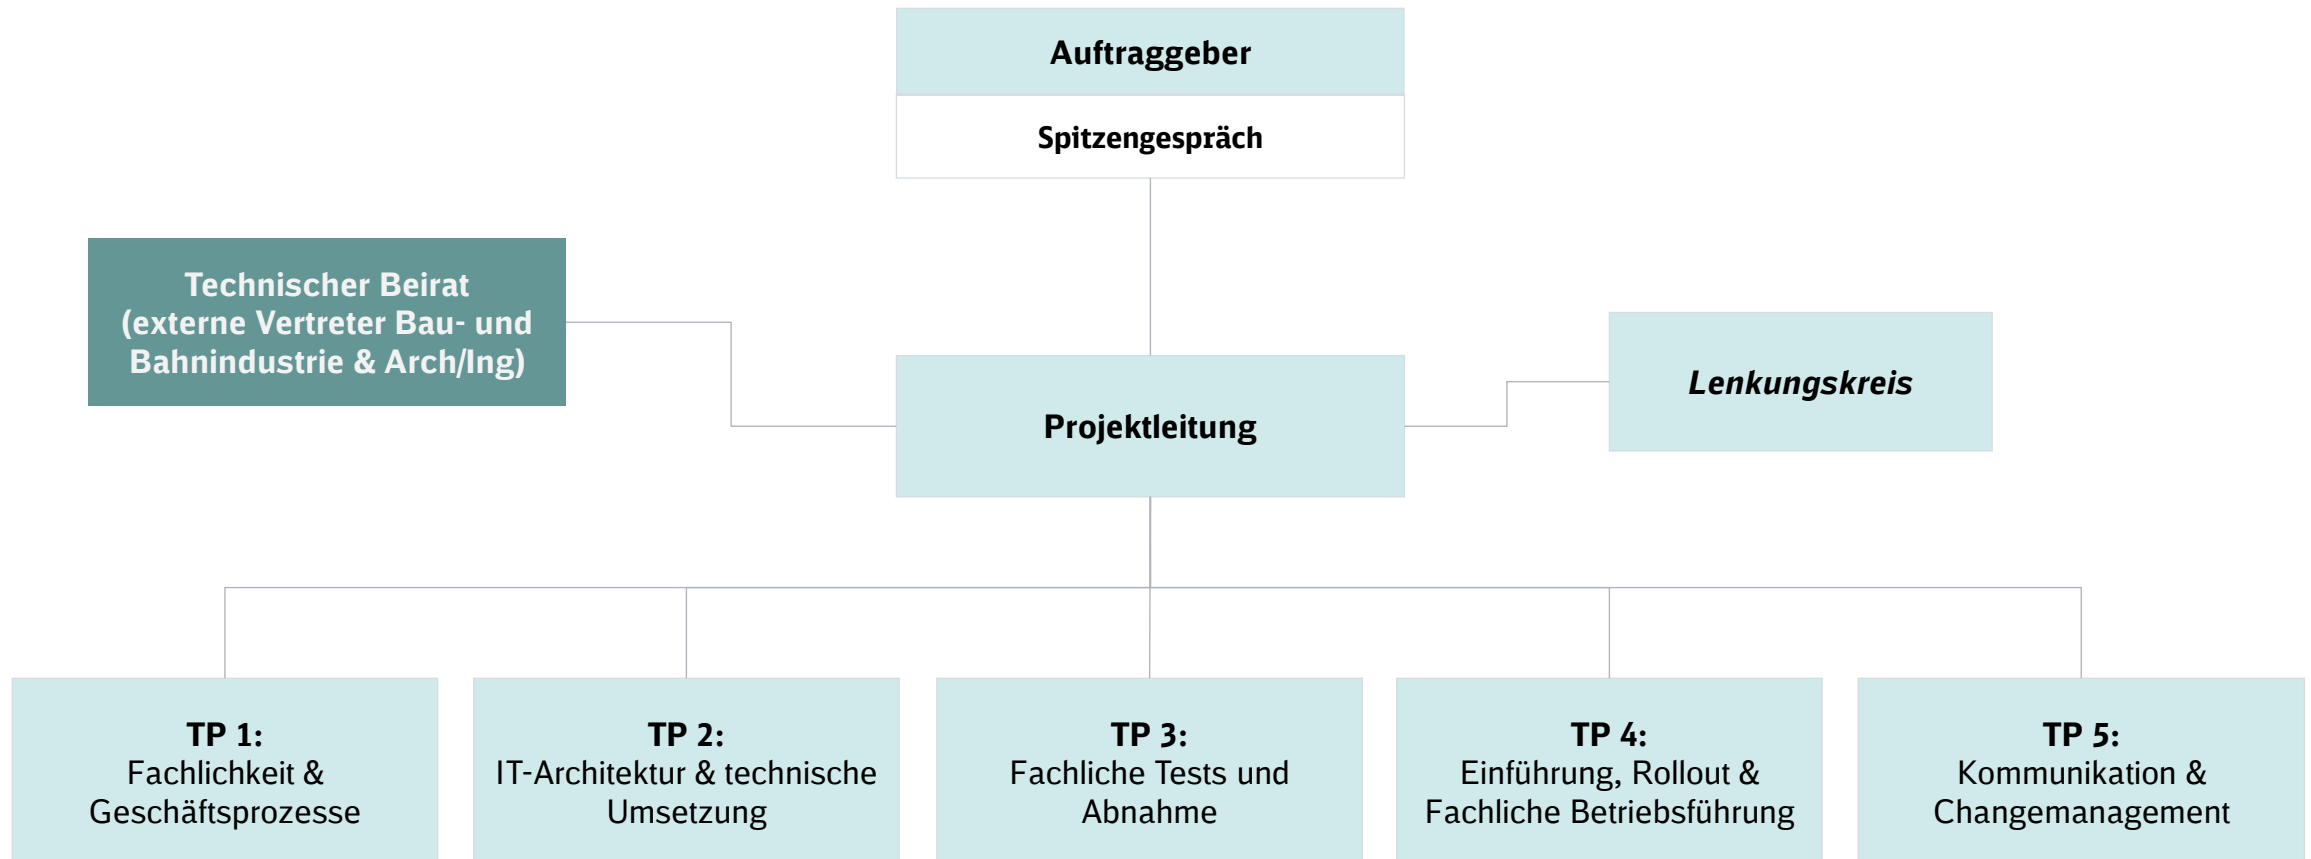

Terminplan zur Einführung der neuen Nachtragsplattform

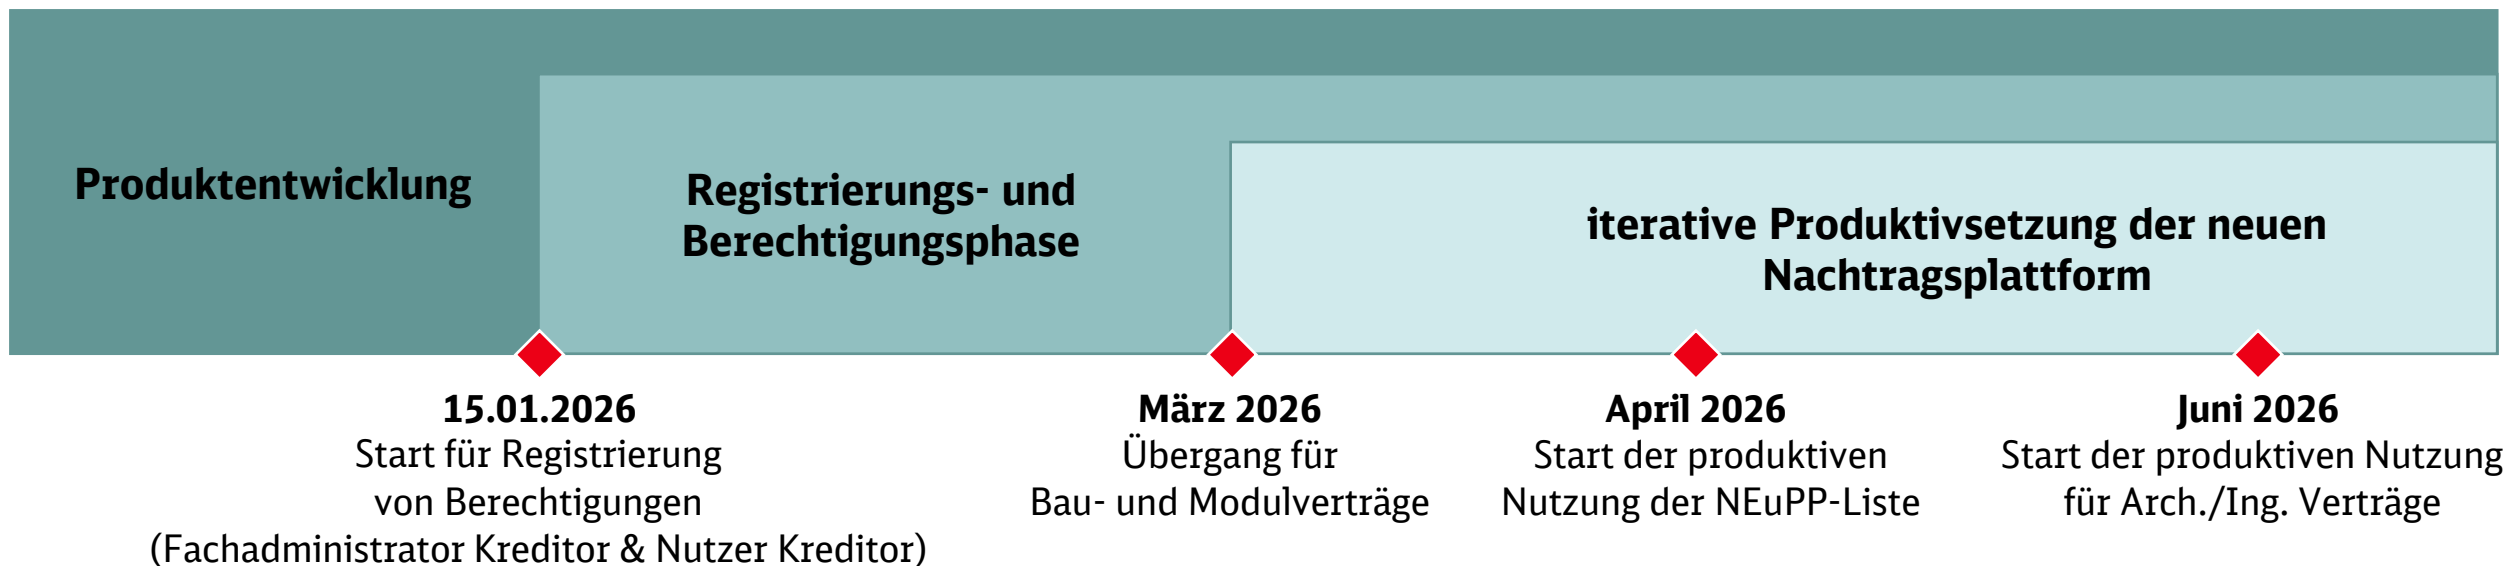

Einführungskommunikation - Termine



03.11.2025 | Vorstellung des aktuellen Sachstandes zum Projekt NTPDataGO



28.11.2025 | Erstkommunikation zu Änderungen ab 01/2026 - Rundmail



28.11.2025 | Termin im Technischen Beirat



12.12.2025 | 1. Einführungstermin (Registrierung Fachadministratoren)



09.01.2026 | 2. Einführungstermin (Registrierung Fachadministratoren)



09.01.2026 | Termin im Technischen Beirat



12.02.2026 | 1. Einführungstermin (NTP-Anwender)

16.02.2026 | 2. Einführungstermin (NTP-Anwender)

Einführungskommunikation - Formate



Kanäle

Externe Website

- NTPDataGO Projektvorstellung
- Change
- Support
- FAQs

Lieferantenportal

- Terminübersicht
- Newsbeiträge

E-Mail

- Aktive Nutzende der alten NTP



Inhalte

- [Berechtigungsantrag](#)
- [Handbuch](#)
- Info- & Videomaterial von den Einführungsveranstaltung ([Download der Präsentation](#))
- [Kurzinfo - Registrierungsprozess](#)



Links

Externe Website

→ [Link](#)

Lieferantenportal

- Informationen und Termine für die Einführungsveranstaltungen zum Download
- → [Link](#)

Ausblick 2026



- Interaktive Oberfläche für die Prüfung dem Grunde und der Höhe nach für Auftraggeberseite
- Proof Of Concept für Vertragsmanagement-Plattform

Weitere Formulare für z.B. Protokolle, Bautagesbericht/ Bautagebuch


Erstkonzeption einer techn. Schnittstelle zur Bauindustrie

- Mai: Arch./Ing Verträge
- April: NEuPP
- März: Modul- und Bauverträge
- Januar: Beginn Phase Benutzerregistrierungen

2026 – Produktrelease 1.0

2025 – Start des IT-Projektes



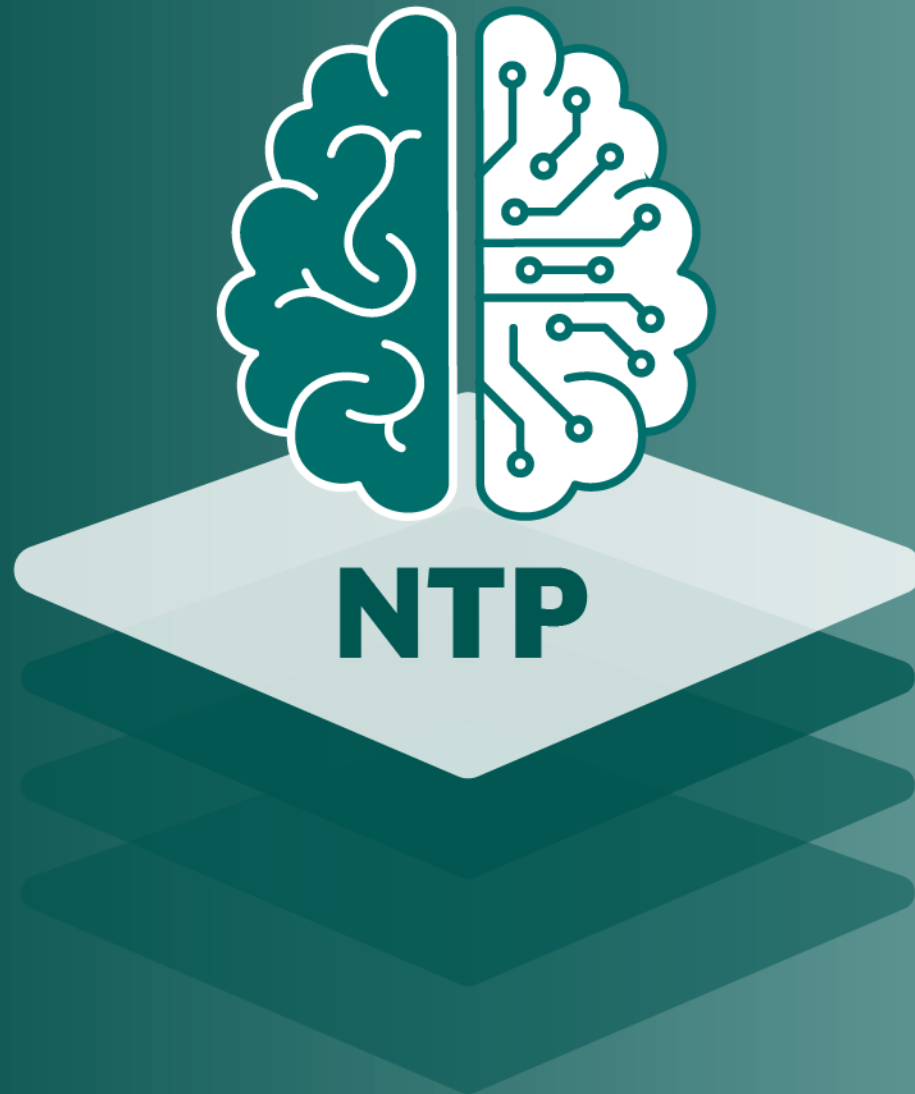

Projektvorstellung 01

Blick in die Nachtragsplattform 02

Austausch & Diskussion 03

Inhalte der Formularmasken mit externer Abstimmung umgesetzt

Gemeinsamer Projektaufsatz

Projekthalte gemeinsam mit Bauwirtschaft, Bahnbauindustrie, Planungsbüros, Verbänden und DB-Vertretern entwickelt.

Externe Abstimmung/Einbindung

Formularinhalte wurden in mehr als 60 Terminen (Fachgruppen/ Workshops) mit über 50 benannten externen Vertretern für Bau-, Ingenieur- und Modulvertrag erarbeitet und unter Einbindung des technischen Beirats beschlossen.

Keine inhaltlichen Änderungen zu den bestehenden vertraglichen Anforderungen

Bauverträge



+



DB

Bauwirtschaft

Ingenieurverträge



+



DB

Bauwirtschaft

Modulverträge



+



DB

Bauwirtschaft



Anordnung

Liegt eine Anordnung des Auftraggebers vor?

- Bitte wählen Sie, in welcher Form die vom AG ausgesprochene Anordnung vorliegt
 - Ja – als NTP-Verknüpfung: auszuwählen, wenn die Anordnung auf der NTP vorliegt (Neue Verknüpfung erstellen)
 - Ja – als Upload: auszuwählen, wenn die Anordnung nicht auf der NTP liegt aber als Datei vorliegt, um hochgeladen zu werden (Dateien auswählen)
 - Ja – mündlich: auszuwählen, wenn die Anordnung durch den AG bisher nur mündlich erfolgt ist
 - Nein: auszuwählen, wenn keine Anordnung durch den AG erfolgte

Erklärung zur Anordnung / Ergänzende Hinweise zur Anordnung

- Hier besteht die Möglichkeit ergänzende Hinweise zur Anordnung darzustellen, falls diese für die Nachtragsbearbeitung relevant sein könnten.
- Sollte aus der verknüpften oder hochgeladenen Anordnung nicht erkennbar sein, wer (Vorname Nachname), wann (TT.MM.JJJJ), wen (Vorname Nachname), wie (Form), was (welche Leistung) angeordnet hat, sind hier die fehlenden Angaben zu ergänzen.
- Liegt eine Anordnung mündlich vor, ist die Erklärung zur Anordnung verpflichtend auszufüllen



Anspruchsgrundlage

Auswahl der Anspruchsgrundlage

- Eine Anspruchsgrundlage ist aus dem Auswahlkatalog auszuwählen.
- Sofern möglicherweise mehrere Anspruchsgrundlagen anwendbar sind, ist nur eine Anspruchsgrundlage nach dem Überwiegendprinzip auszuwählen
- Ist keine der genannten Anspruchsgrundlagen zutreffend, ist die Option „Keine der genannten Anspruchsgrundlagen“ aus dem Katalog auszuwählen. Es öffnet sich dann ein zusätzliches Feld zur Angabe einer sonstigen Anspruchsgrundlage. Hier ist anzugeben, welche sonstige rechtliche Anspruchsgrundlage geltend gemacht werden soll.

Upload ergänzender Dokumente

- Falls weitere Nachweise für die Prüfung relevant sein könnten und zuvor nicht abgefragt wurden, können diese hier hochgeladen werden.
- Die Dateinamen der Dokumente sollten so gewählt werden, dass der Inhalt erkennbar ist und somit eine Abgrenzung zu weiteren Dokumenten deutlich wird.

Projektvorstellung 01


Blick in die Nachtragsplattform 02

Austausch & Diskussion 03



Vielen Dank!

Austausch & Diskussion

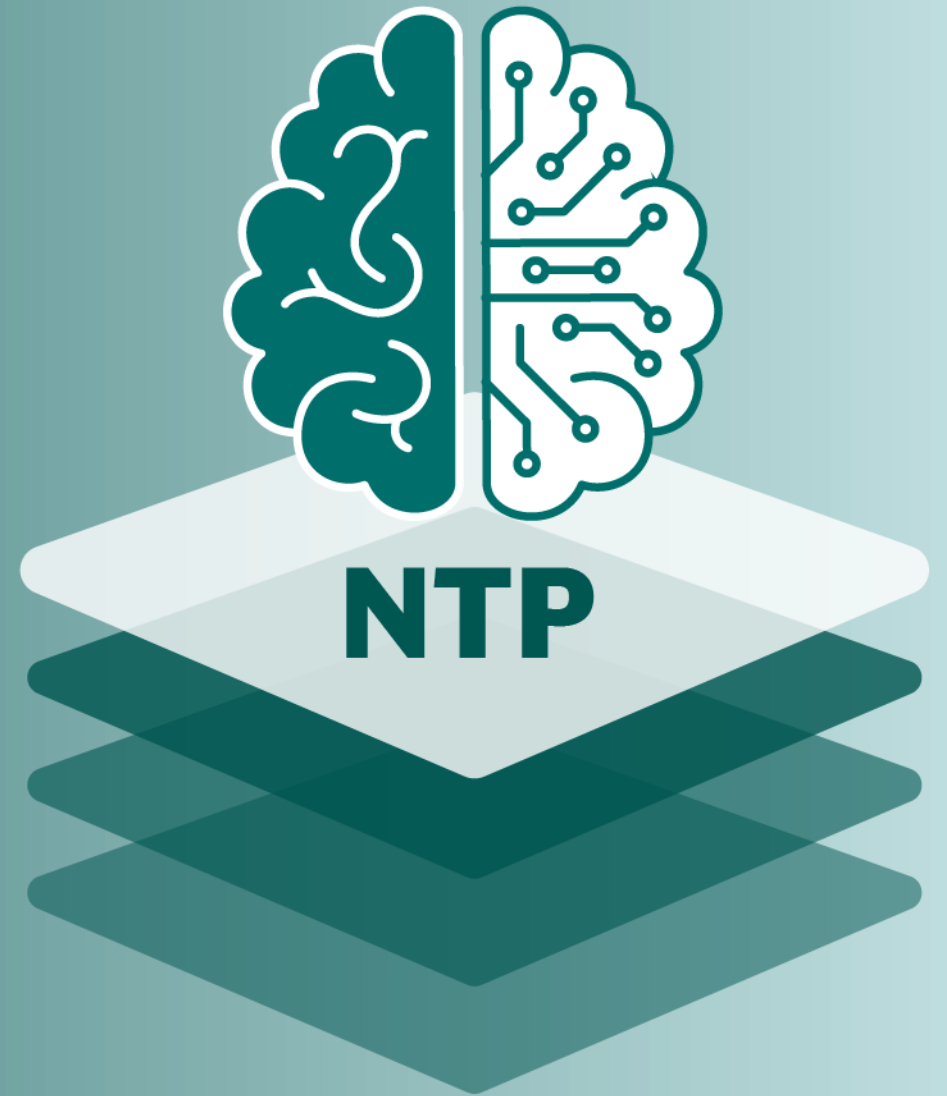

NTPDataGO

Übergangsprozess von alter auf neue Nachtragsplattform

Übergang für Bau- und Modulverträge:


- Ab 03/2026: Einreichung neuer NT, Anzeigen und Anordnungen ausschließlich auf der neuen NTP (für laufende und neue Verträge).
- Kommunikation wie Nachlieferungen, Schriftverkehr, Bestellschreiben etc. zu bestehenden Vorgängen bis 30.06.2026 auf alter NTP möglich. Ab 07/2026 ggf. notwendige Kommunikation nur noch per E-Mail.

Einführung für Architekten-/Ingenieurverträge:

- Verpflichtend Nutzung der neuen NTP für Verträge mit Zuschlagsdatum ab 01.01.2026.
- Verträge mit früherem Zuschlagsdatum können die Nachtragsplattform freiwillig nutzen.

Notwendigkeit des gewählten Übergangs:

- ID-Logik beider Systeme passt nicht zusammen – eine Migration beschädigt Verknüpfungen und gefährdet Datenqualität massiv.
- Abkündigung der für die alte Nachtragsplattform genutzten SharePoint-Version zum 30.06.2026, Weiterbetrieb wäre teuer und aufwendig
- NTP ist kein Archivsystem: Fokus auf Performance; sauberer Neustart ohne Altdaten-Migration vermeidet hohe Kosten, Testaufwände und Datenrisiken.
- Stabilität und Datenqualität: Altvorgänge bleiben dort, wo sie entstanden sind, bis sie abgeschlossen sind.

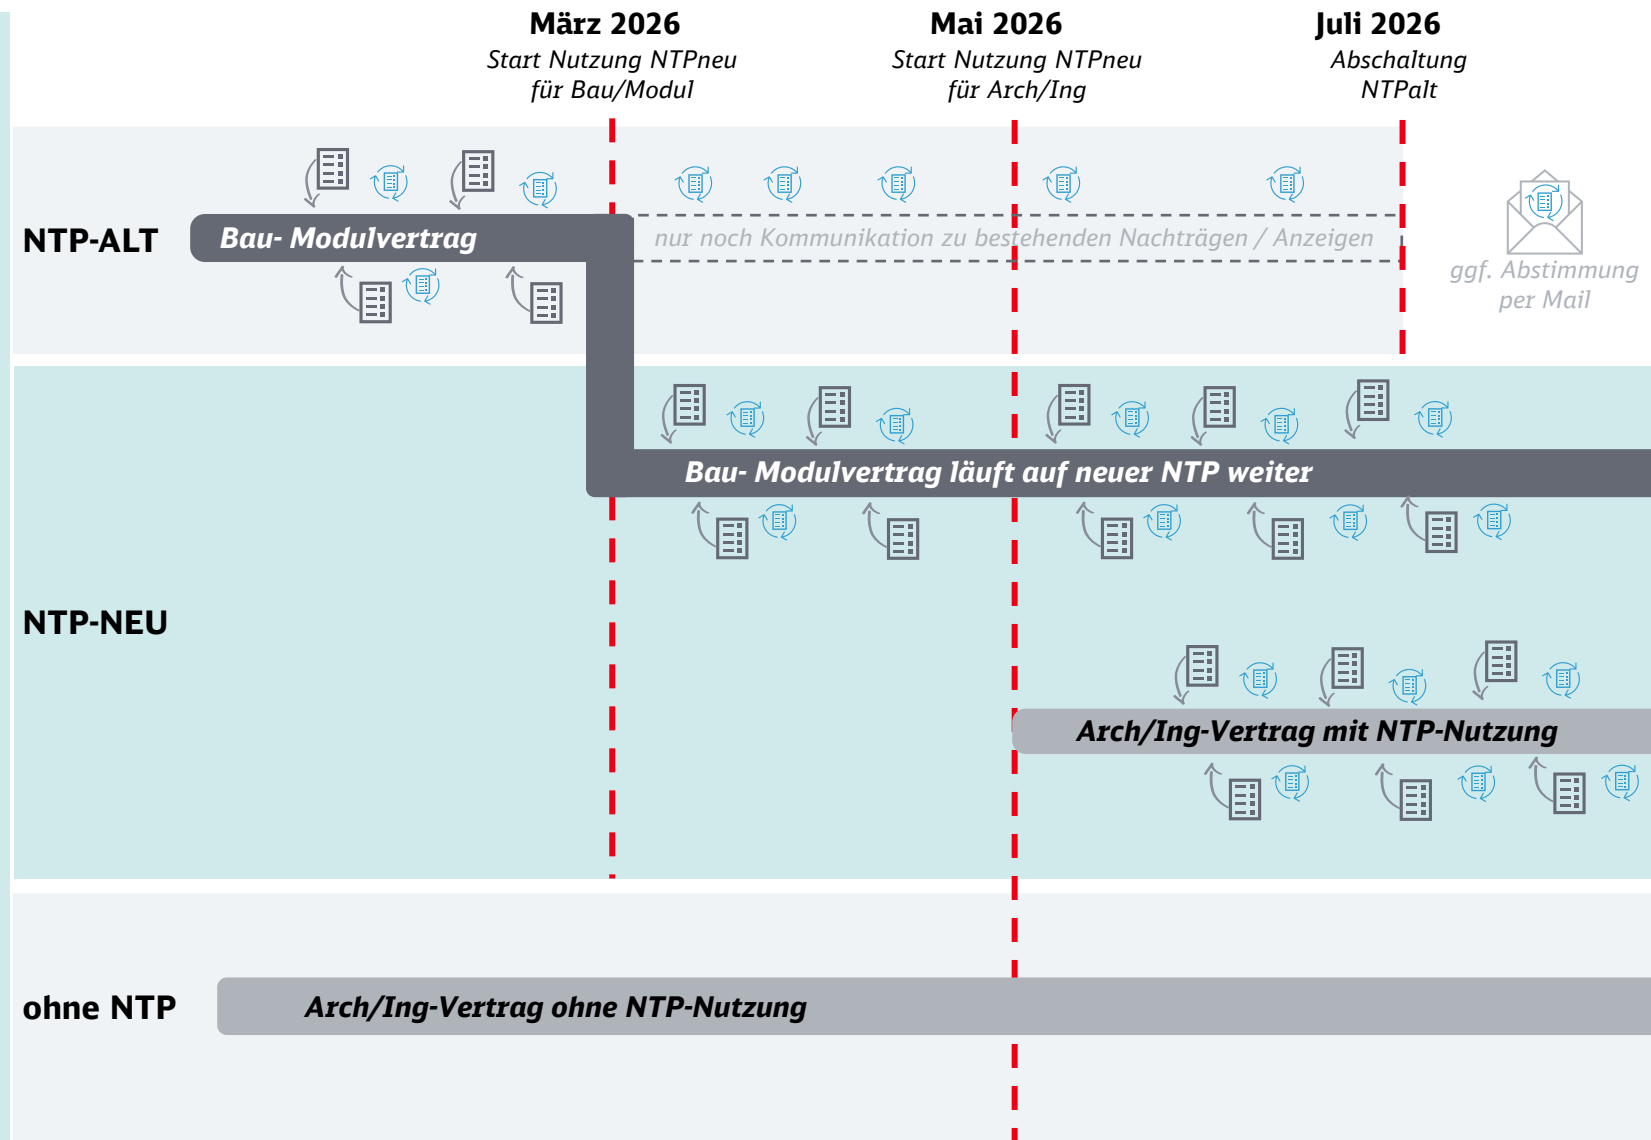

Neue Nachtragsplattform

Alle Verträge

[Alle Verträge](#)
[Alle Vorgänge](#)
[Alle Vorgangsakten](#)

★ Meine Vertrags-Favoriten

Schlussgerechnete Verträge anzeigen

Suche





Vertrags-Nr.	Vertrags-Bezeichnung	Erstellt am	Vertragsbez. durch Kreditor	Vergabevorgang	Proj.-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Kredit
☆ 92263940	Vorabmaßnahmen (Umverle...	25.07.2025	-	18TEI33369	T016051719	2980/9,967 Erneuerung EÜ übe...		+ ⓘ
☆ AS_16	K'then (a)-Abzw Am (a) - Bs...	25.07.2025	721-672-79898	18GEI34386	T016051721	2980/18,033 Ern.EÜ Kreuzungs...		+ ⓘ
☆ K2S9SSW_B01	Vertrag 88	25.07.2025	651-579-89942	18GEI34263	T016056425	Umb.Haideburg-Dessau Süd k...		+ ⓘ
☆ 30	WE Weichen 609-615,624,1...	25.07.2025	479-965-78995	19FEI38522	T016068015	*3601*Ern.Whzanlage W1,4,4a,...		+ ⓘ
☆ LieferV_01	Mast 493 Drehtrennschalter ...	25.07.2025	378-575-52306	12TEI01103	T016072497	Umbau Dessau-Dessau Süd km...		+ ⓘ
☆ 16 BV 92269951-3	Bau + SiLei	25.07.2025	787-755-45256	18FEI35554	T016072498	Umbau Dessau Süd-Dessau km...		+ ⓘ
☆ VE_B40	Brandmeldeanlage	25.07.2025	460-625-78004	18GEI34755	T016075589	Neub. Whz 2 in Altenhundem		+ ⓘ
☆ 19FEI38475	NB DL 48,389	25.07.2025	370-517-2818	19FEI38475	T016078467	Erweit. Rangierfahrstr. Lpz-Con...		+ ⓘ
☆ 92271607	GE/GEoS Hockeroda-Probst...	25.07.2025	412-819-60860	18GEI36994	G016169674	4550BÜ KM020,424 ERNG ALT...		+ ⓘ
☆ 02-BA-003	Ausschreibung OLA	25.07.2025	497-937-16023	18FEI31128	G016169681	3450BÜ KM083,626 ERNG RIE...		+ ⓘ
☆ 26-BAU-00-260003	GU 3 - 50 Hz und Kabelverle...	25.07.2025	707-332-70164	16FEI26080 Los 1	G016172230	Strecke 5710E KM 012,727 Ern...		+ ⓘ
☆ 44	End-IT-Bau-Objekt...	25.07.2025	645-600-86400	18FEI38504	G016173044	Strecke 5720E km 1,574 Ern...		+ ⓘ

19 von 19 Zeilen geladen

Neue Nachtragsplattform

Alle Vorgänge

DB InfraGO Nachtragsplattform | **Nachtragsmanagement** | NPP-Liste

VE B40 Bauvertrag
Brandmeldeanlage | 460-625-78004, Neub. Whz 2 in Altenhündem

Ansicht: Alle Vorgänge | Neuen Vorgang erstellen | Aktuelle Ansicht exportieren (.csv) | Suche

Vorgangstyp	Vorgangsbezeichnung	Nummer	Eingangsdatum	Letzte Änderung	Status	Statusdatum		
Nachtrag (BV)	BK_Test_NTP_NT_PSS-Nr_2026...	851	14.01.2026	14.01.2026 03:06	Formale Prüfung abgeschlossen	14.01.2026	+	i
Nachtrag (BV)	BK_Test_NTP_NT_20260113_1745	739	13.01.2026	13.01.2026 05:44	Eingegangen	13.01.2026	+	i
Mehrkostenanzeige (BV)	BKs_Mehrkostenanzeige_NTPne...	1	06.01.2026	06.01.2026 01:04	Eingegangen	06.01.2026	+	i
Behinderungsanzeige (BV)	Behinderungsanzeige_1012	2	10.12.2025	10.12.2025 01:28	Eingegangen	10.12.2025	+	i
Nachtrag (BV)	Nachtrag Test VRI SST	3456	09.12.2025	09.12.2025 03:02	Eingegangen	09.12.2025	+	i
Nachtrag (BV)	Nachtrag SST VRI	2345	09.12.2025	09.12.2025 11:14	Eingegangen	09.12.2025	+	i

6 Zeilen geladen

Neue Nachtragsplattform

Neuen Vorgang erstellen

DB InfraGO Nachtragsplattform | Nachtragsmanagement | NPP-Liste

VE B40 Bauvertrag
Brandmeldeanlage | 460-625-78004, Neub. Whz 2 in Altenhudem

Ansicht: Alle Vorgänge

Neuen Vorgang erstellen ^

Aktuelle Ansicht exportieren (.csv)

Suche

Vorgangstyp	Vorgangsbezeichnung	Nummer	Eingangsd	Status	Statusdatum		
Nachtrag (BV)	BK_Test_NTP_NT_PSS-Nr_2026...	851	14.01.2026	Formale Prüfung abgeschlossen	14.01.2026	+	i
Nachtrag (BV)	BK_Test_NTP_NT_20260113_1745	739	13.01.2026	Eingegangen	13.01.2026	+	i
Mehrkostenanzeige (BV)	BKs_Mehrkostenanzeige_NTPne...	1	06.01.2026	Eingegangen	06.01.2026	+	i
Behinderungsanzeige (BV)	Behinderungsanzeige_1012	2	10.12.2025	Eingegangen	10.12.2025	+	i
Nachtrag (BV)	Nachtrag Test VRI SST	3456	09.12.2025	Eingegangen	09.12.2025	+	i
Nachtrag (BV)	Nachtrag SST VRI	2345	09.12.2025	Eingegangen	09.12.2025	+	i

6 Zeilen geladen

- Nachtrag (BV)
- Anzeige Vertragsabweichung (BV)
- Mehrkostenanzeige (BV)
- Behinderungsanzeige (BV)
- Bedenkenanzeige (BV)

Anzeige einer Vertragsabweichung

1. Stammdaten

DB InfraGO Nachtragsplattform ? ⚙️

WHZ Schirnding 1 Bauvertrag ?

Bez WHZ | Vertragsbezeichnung_WHZ:Hier steht jetzt Text, 5903, km 138,280, WHZ Schirnding ...

Anzeige einer Vertragsabweichung (BV)

- 1. Stammdaten**
- 2. Angaben zur Anordnung
- 3. Anspruchsgrundlage
- 4. Bau Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung
- 5. Bau-Ist | Kurzbeschreibung der Vertragsabweichung
- 6. Zeitliche Zuordnung der vertragsabweichenden Arbeiten
- 7. Auswirkungen und Folgemaßnahmen
- 8. Kostenveränderungen
- 9. Bezug zu Anzeigen

1. Stammdaten

1.1 Stammdaten zur Anzeige einer Vertragsabweichung ?

Laufende Nummer der Anzeige der Vertragsabweichung*

Titel der Anzeige der Vertragsabweichung*

Aktenzeichen des Auftragnehmers

1.2 Kontaktperson des Auftragnehmers ?

Anrede

Vorname

Nachname

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

⏪ ⏩

✕ Abbrechen 📄 Entwurf herunterladen (PDF) 💾 Entwurf speichern 📤 Formular absenden

Anzeige einer Vertragsabweichung

Datum:		Fortlaufende Nr.:	
		<small>(ggf. Systematik gem. NEuPP)</small>	
Vertragsabwickelnde Stelle (des AG):			
Titel der Anzeige der Vertragsabweichung:			
Projektbezeichnung:			
Projektnummer: <small>(soweit bekannt)</small>		Bestell-Nr. Hauptvertrag:	
Teilprojektnummer: <small>(soweit bekannt)</small>		Vertragsnummer:	
Auftragnehmer:			

Anzeige einer Vertragsabweichung

2. Angaben zur Anordnung

Anzeige einer Vertragsabweichung (BV)

1. Stammdaten
- 2. Angaben zur Anordnung**
3. Anspruchsgrundlage
4. Bau Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung
5. Bau-Ist | Kurzbeschreibung der Vertragsabweichung
6. Zeitliche Zuordnung der vertragsabweichenden Arbeiten
7. Auswirkungen und Folgemaßnahmen
8. Kostenveränderungen
9. Bezug zu Anzeigen

2. Angaben zur Anordnung

2.1 Anordnung ⓘ

Liegt eine Anordnung des Auftraggebers vor?*

Ja - als NTP-Verknüpfung ▾

Liegt eine Anordnung des Auftraggebers vor?*

Ja - als Upload

Liegt eine Anordnung des Auftraggebers vor?*

Ja - mündlich

Liegt eine Anordnung des Auftraggebers vor?*

Nein ▾

Verknüpfung der Anzeige mit einer Anordnung

🔗 [Neue Verknüpfung erstellen](#)

Ergänzende Hinweise zur Anordnung

🖨️ ▾ B I U ✂️ ⌵ ⌶

< [Zurück](#)

[Weiter](#) >



Anzeige einer Vertragsabweichung - bisher Anordnung

1. Anordnung der Vertragsabweichung bereits erfolgt?

Nein

Ja, durch:

Detaillierte Darstellung, wer, wann, wen, wie, was angeordnet hat → siehe Anlage

Anzeige einer Vertragsabweichung

3. Anspruchsgrundlage

DB InfraGO Nachtragsplattform 🗨️ ⚙️

WHZ Schirnding 1 Bauvertrag 🔒

Bez WHZ | Vertragsbezeichnung_WHZ:Hier steht jetzt Text, 5903, km 138,280, WHZ Schirnding ...

Anzeige einer Vertragsabweichung (BV)

- 1. Stammdaten
- 2. Angaben zur Anordnung
- 3. Anspruchsgrundlage**
- 4. Bau Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung
- 5. Bau-Ist | Kurzbeschreibung der Vertragsabweichung
- 6. Zeitliche Zuordnung der vertragsabweichenden Arbeiten
- 7. Auswirkungen und Folgemaßnahmen
- 8. Kostenveränderungen
- 9. Bezug zu Anzeigen

3. Anspruchsgrundlage

3.1 Anspruchsgrundlage ⓘ

Auswahl der Anspruchsgrundlage*

Bitte auswählen... ▾

Upload ergänzender Dokumente

Dateien zum Hochladen in diesem Bereich ablegen
oder

[📁 Dateien auswählen](#)

[← Zurück](#) [Weiter →](#)

[✕ Abbrechen](#) [📄 Entwurf herunterladen \(PDF\)](#) [💾 Entwurf speichern](#) [Formular absenden](#)

Anzeige einer Vertragsabweichung – bisher
Anspruchsgrundlage

2. Anspruchsgrundlage gem. VOB/B (ein Kreuz nach Überwiegendprinzip):

- Änderung des Bauentwurfes (§ 2 Abs. 5)
- Nicht vorgesehene Leistung (§ 2 Abs. 6)
- Geänderte Pauschalpreis-Leistung (§ 2 Abs. 7)

Anzeige einer Vertragsabweichung

4. Bau Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung

Anzeige einer Vertragsabweichung (BV)

1. Stammdaten
2. Angaben zur Anordnung
3. Anspruchsgrundlage
- 4. Bau Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung**
5. Bau-Ist | Kurzbeschreibung der Vertragsabweichung
6. Zeitliche Zuordnung der vertragsabweichenden Arbeiten
7. Auswirkungen und Folgemaßnahmen
8. Kostenveränderungen
9. Bezug zu Anzeigen

4. Bau Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung

4.1 Vertragsbestandteil und exakte Fundstelle ⓘ

Beschreibung der exakten Fundstellen im ausgewählten Vertragsbestandteil*

Rich text editor with toolbar (bold, italic, underline, link, unlink, bulleted list, numbered list) and a large text area.

+ Weiteren Vertragsbestandteil hinzufügen

Ergänzende Hinweise zur ursprünglich vertraglich geschuldeten Leistung

Rich text editor with toolbar (bold, italic, underline, link, unlink, bulleted list, numbered list) and a large text area.

Upload ergänzender Dokumente

Dateien zum Hochladen in diesem Bereich ablegen
oder

📎 Dateien auswählen

< Zurück

Weiter >



Anzeige einer Vertragsabweichung – *Text Ausfüllhilfe*

4. 1 Vertragsbestandteil und exakte Fundstelle



Vertragsbestandteil und exakte Fundstelle

Auswahl des Vertragsbestandteiles

- Vertragsteile des Hauptvertrags, die von einer Änderung betroffen sind, sind aus dem Auswahlkatalog auszuwählen.
- Vertragsbestandteile, an die sich zusätzliche Leistungen anschließen, sind ebenfalls darzustellen.
- Falls keine der genannten Hauptvertragsleistungen betroffen sind, ist "Sonstige (Vertrags-)Grundlagen" auszuwählen.
- Mindestens eine Auswahl ist erforderlich
- Soweit mehrere Vertragsbestandteile betroffen sind, sind diese jeweils anzugeben über "Weiteren Vertragsbestandteil hinzufügen" kann die Auswahl erweitert werden.

Beschreibung der exakten Fundstellen im ausgewählten Vertragsbestandteil

- Zu dem jeweils ausgewählten Vertragsbestandteil sind hier die exakten Fundstellen zu benennen, z.B.
 - Positionsnummern des LV
 - Seitennummer der Vorbemerkung/ Baubeschreibung
 - Überschrift
 - Gliederungspunkt
 - Plan-Nummern
- Damit soll dem AG eine exakte Zuordnung möglich werden.
- Bei Auswahl „Die übrigen Anlagen des Bauvertrags“ wird hier ergänzend die Benennung der betreffenden Vertragsanlage erforderlich.
- Bei Auswahl „Sonstige (Vertrags-) Grundlagen“ wird hier eine detaillierte Darstellung mit folgenden Angaben erforderlich:
 - die Benennung der sonstigen (Vertrags-) Grundlage inkl. der exakten Fundstelle oder
 - die Angabe, dass keine Grundlage als passend angesehen wird.

Ergänzende Hinweise zur ursprünglich vertraglich geschuldeten Leistung

- Hier besteht die Möglichkeit, ergänzende Hinweise zur inhaltlichen Detaillierung der ursprünglich vertraglich geschuldeten Leistung darzustellen

Upload ergänzender Dokumente

- Falls weitere Nachweise für die Prüfung relevant sein könnten und zuvor nicht abgefragt wurden, können diese hier hochgeladen werden.
- Die Dateinamen der Dokumente sollten so gewählt werden, dass der Inhalt erkennbar ist und somit eine Abgrenzung zu weiteren Dokumenten deutlich wird.

Anzeige einer Vertragsabweichung – bisher Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung

3. Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung (Mehrfachnennungen möglich):

Der AN benennt alle nachstehend genannten Quellen (Vertragsbestandteile, die von der Vertragsabweichung betroffen sind), um es dem AG zu ermöglichen, unverzüglich eine Anordnung der Vertragsabweichung zu treffen. Der AG bewertet nur die vom AN angegebenen Quellen und trifft nur auf dieser Grundlage umgehend eine Entscheidung. Wird zu einem späteren Zeitpunkt (spätestens bei der Prüfung der Schlussrechnung) festgestellt, dass die vom AN gemachten Angaben unvollständig sind, erfolgt durch den AG eine Neubewertung. Ist eine vom AG getroffene Anordnung auf Grund der bisher nicht berücksichtigten Quellen nicht mehr berechtigt, da die angeordnete Leistung vom ursprünglichen vertraglichen Leistungsinhalt umfasst ist, entfällt der aus der Anordnung resultierende Vergütungsanspruch des AN. Der AG wird das dem AN unverzüglich mitteilen. Die Regelungen des § 2 Abs. 8 VOB/B bleiben unberührt.

Zuschlagsschreiben inkl. der dort genannten Unterlagen, dort:
(z.B. von beiden Parteien unterzeichnete Protokolle, Bieterfragen und Antworten)

Bauvertrag, dort:

vom AN im Rücklaufexemplar eingetragene Bieterangaben und Preise, dort:

Leistungsverzeichnis, dort:
(z.B. Seite / Los / Unterlos / Position)

Vorbemerkungen / Baubeschreibung, dort:
(z.B. Seite / Gliederungs-Nr. / weitere Angaben)

Zeichnungen / Pläne dort:
(z.B. Plan-/Zeichnungsbezeichnung / Nr. / Datum / Anlage Nr. des Bauvertrages etc.)

Behördliche Auflagen, z.B. Planfeststellungsbeschluss / Genehmigungen, dort:
(z.B. Art d. Verwaltungsaktes, ausstellende Behörde / Seite / Gliederungs-Nr. / Anl. Nr. des Bauvertrages / weitere Angaben)

Gutachten, dort:
(Art des Gutachtens / Ersteller / Anlage Nr. des Bauvertrages / Seite / Gliederungs-Nr. / weitere Angaben)

Besondere Vertragsbedingungen zu § 16, dort:

Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB-DB), dort:

Übrige Anlagen des Vertrages, dort:
(Anlage Nr. des Bauvertrages / Titel der Anlage / Seite / Gliederungs-Nr. / weitere Angaben)

Zusätzliche technische Bestimmungen (Anlage 2.3 des Bauvertrages), Regelwerk der DB AG, öffentlich-rechtliche Bestimmungen, dort:
(z.B. Titel / Seite / Gliederungs-Nr. / weitere Angaben)

Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), dort:

Allgemeine technische Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/C), dort:
(Titel der DIN, Abschnitt / Ziffer / weitere Angaben)

Sonstige Grundlagen:

Anzeige einer Vertragsabweichung

5. Bau-Ist | Kurzbeschreibung der Vertragsabweichung

DB InfraGO Nachtragsplattform 🔔 ⚙️

WHZ Schirnding 1 Bauvertrag 📄

Bez WHZ | Vertragsbezeichnung_WHZ:Hier steht jetzt Text, 5903, km 138,280, WHZ Schirnding ...

Anzeige einer Vertragsabweichung (BV)

1. Stammdaten
2. Angaben zur Anordnung
3. Anspruchsgrundlage
4. Bau Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung
- 5. Bau-Ist | Kurzbeschreibung der Vertragsabweichung**
6. Zeitliche Zuordnung der vertragsabweichenden Arbeiten
7. Auswirkungen und Folgemaßnahmen
8. Kostenveränderungen
9. Bezug zu Anzeigen

←

5. Bau-Ist | Kurzbeschreibung der Vertragsabweichung

5.1 Vertragsabweichung ?

Abweichung von der vorstehend in Punkt 4 benannten vertraglich geschuldeten Leistung*

📄 ▼ B I U ✂️ ::=

Upload ergänzender Dokumente

Dateien zum Hochladen in diesem Bereich ablegen
oder

📁 Dateien auswählen

← [Zurück](#) [Weiter](#) →

✕ Abbrechen

📄 Entwurf herunterladen (PDF)

💾 Entwurf speichern

📤 Formular absenden

Anzeige einer Vertragsabweichung – bisher

Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung

4. Kurzbeschreibung der Vertragsabweichung: Abweichung von der vorstehend unter Nr. 3. benannten vertraglich geschuldeten Leistung

(Wenn unter Nr. 3 Mehrfachnennung vorgenommen wurden, ist auf jede Nennung auch hier einzugehen)

(Ggf. Fortsetzung auf zusätzlichem Blatt)

Anzeige einer Vertragsabweichung

6. Zeitliche Zuordnung der vertragsabweichenden Arbeiten

DB InfraGO Nachtragsplattform ? ⚙️

WHZ Schirnding 1 Bauvertrag ⓘ

Bez WHZ | Vertragsbezeichnung_WHZ:Hier steht jetzt Text, 5903, km 138,280, WHZ Schirnding ...

Anzeige einer Vertragsabweichung (BV)

1. Stammdaten
2. Angaben zur Anordnung
3. Anspruchsgrundlage
4. Bau Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung
5. Bau-Ist | Kurzbeschreibung der Vertragsabweichung
- 6. Zeitliche Zuordnung der vertragsabweichenden Arbeiten**
7. Auswirkungen und Folgemaßnahmen
8. Kostenveränderungen
9. Bezug zu Anzeigen

6. Zeitliche Zuordnung der vertragsabweichenden Arbeiten

6.1 Zeitliche Zuordnung ?

(Voraussichtlicher) Beginn der Leistungen*

 🗓️

(Voraussichtliches) Ende der Leistungen*

 🗓️

Ergänzende Hinweise zur zeitlichen Zuordnung der vertragsabweichenden Arbeiten

🔴 ▾ B I U ✎ ⌵ ⌶

|

Upload ergänzender Dokumente

Dateien zum Hochladen in diesem Bereich ablegen oder

📁 Dateien auswählen

[< Zurück](#) [Weiter >](#)

←

✕ Abbrechen 📄 Entwurf herunterladen (PDF) 💾 Entwurf speichern 📤 Formular absenden

Anzeige einer Vertragsabweichung – bisher

Ausführung der vertragsabweichenden Arbeiten

5. Ausführung der vertragsabweichenden Arbeiten:

- Beginn voraussichtlich am:
- Bereits begonnen am:
- Ende (voraussichtlich) am:

Anzeige einer Vertragsabweichung

7. Auswirkungen und Folgemaßnahmen

DB InfraGO Nachtragsplattform ? ⚙️

WHZ Schirnding 1 Bauvertrag i

Bez WHZ | Vertragsbezeichnung WHZ:Hier steht jetzt Text, 5903, km 138,280, WHZ Schirnding ...

Anzeige einer Vertragsabweichung (BV)

- 1. Stammdaten
- 2. Angaben zur Anordnung
- 3. Anspruchsgrundlage
- 4. Bau Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung
- 5. Bau-Ist | Kurzbeschreibung der Vertragsabweichung
- 6. Zeitliche Zuordnung der vertragsabweichenden Arbeiten
- 7. Auswirkungen und Folgemaßnahmen**
- 8. Kostenveränderungen
- 9. Bezug zu Anzeigen ←

7. Auswirkungen und Folgemaßnahmen

7.1 Betriebserschwerisse ?

Liegen Betriebserschwerisse vor?*

Bitte auswählen... ▼

Upload ergänzender Dokumente

Dateien zum Hochladen in diesem Bereich ablegen
oder

↑ Dateien auswählen

7.2 Auswirkungen auf andere Auftragnehmer ?

Liegen Auswirkungen auf andere Auftragnehmer vor?*

Bitte auswählen... ▼

Upload ergänzender Dokumente

Dateien zum Hochladen in diesem Bereich ablegen
oder

↑ Dateien auswählen

✕ Abbrechen ↓ Entwurf herunterladen (PDF) 💾 Entwurf speichern Formular absenden

Anzeige einer Vertragsabweichung – bisher
Auswirkungen/Folgemaßnahmen

6. Auswirkungen/Folgemaßnahmen:

Betriebserschwerisse:

Auswirkungen auf andere Auftragnehmer:
*(welche anderen AN / welche Leistungsbereiche –
soweit bekannt)*

Auswirkungen auf die Bauzeit:
*(auf welche Vorgangs-Nr. im Bauzeitenplan und
Leistungen gem. LV)*

geänderte/zusätzliche Beistellungen:

Anzeige einer Vertragsabweichung

7. Auswirkungen und Folgemaßnahmen

WHZ Schirnding 1 Bauvertrag

Bez WHZ | Vertragsbezeichnung_WHZ:Hier steht jetzt Text, 5903, km 138,280, WHZ Schirnding ...




7.3 Auswirkungen auf die Bauzeit ?

Liegen Auswirkungen auf die Bauzeit vor?*

Bitte auswählen... ▼

Upload ergänzender Dokumente

Dateien zum Hochladen in diesem Bereich ablegen
oder

 Dateien auswählen


7.4 Geänderte oder zusätzliche Beistellungen ?

Liegen geänderte oder zusätzliche Beistellungen vor?*

Bitte auswählen... ▼

Upload ergänzender Dokumente

Dateien zum Hochladen in diesem Bereich ablegen
oder


 Dateien auswählen



[← Zurück](#)

[Weiter >](#)

✕ Abbrechen

 Entwurf herunterladen (PDF)

 Entwurf speichern

Formular absenden

Anzeige einer Vertragsabweichung

8. Kostenveränderungen

WHZ Schirnding 1 Bauvertrag

Bez WHZ | Vertragsbezeichnung WHZ:Hier steht jetzt Text, 5903, km 138,280, WHZ Schirnding ...

Anzeige einer Vertragsabweichung (BV)

- 1. Stammdaten
- 2. Angaben zur Anordnung
- 3. Anspruchsgrundlage
- 4. Bau Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung
- 5. Bau-Ist | Kurzbeschreibung der Vertragsabweichung
- 6. Zeitliche Zuordnung der vertragsabweichenden Arbeiten
- 7. Auswirkungen und Folgemaßnahmen
- 8. Kostenveränderungen**
- 9. Bezug zu Anzeigen

8. Kostenveränderungen

8.1 Mehrkosten ?

Werden Mehrkosten entstehen?*

Bitte auswählen... ▼

8.2 Minderkosten ?

Werden Minderkosten entstehen?*

Bitte auswählen... ▼

8.3 Ergänzungen ?

Upload ergänzender Dokumente zu 8.1 und 8.2

Dateien zum Hochladen in diesem Bereich ablegen
oder

↑ Dateien auswählen

[← Zurück](#) [Weiter >](#)

✕ Abbrechen

↓ Entwurf herunterladen (PDF) 📁 Entwurf speichern **Formular absenden**

Anzeige einer Vertragsabweichung – bisher Kostenveränderung

7. Kostenveränderungen:

Mehrkosten:

Minderkosten:

(Minderkostendarstellung insbesondere bzgl. der Leistungsteile, die z.B. bei Änderung des Bauentwurfes nicht mehr ausgeführt werden)

siehe auch Nr. 8 dieser Anzeige

Anzeige einer Vertragsabweichung

9. Bezug zu Anzeigen

WHZ Schirnding 1 Bauvertrag

Bez WHZ | Vertragsbezeichnung_WHZ:Hier steht jetzt Text, 5903, km 138,280, WHZ Schirnding ...



Anzeige einer Vertragsabweichung (BV)

1. Stammdaten
2. Angaben zur Anordnung
3. Anspruchsgrundlage
4. Bau Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung
5. Bau-Ist | Kurzbeschreibung der Vertragsabweichung
6. Zeitliche Zuordnung der vertragsabweichenden Arbeiten
7. Auswirkungen und Folgemaßnahmen
8. Kostenveränderungen
- 9. Bezug zu Anzeigen** ←

9. Bezug zu Anzeigen

9.1 Verknüpfung

Für diesen Vorgang ist bisher keine Verknüpfung vorhanden.

[🔗 Neue Verknüpfung erstellen](#)

[← Zurück](#)

Anzeige einer Vertragsabweichung

9. Bezug zu Anzeigen

DB InfraGO Nachtragsplattform

WHZ Schirnding 1 Bauvertrag

Bez WHZ | Vertragsbezeichnung_WHZ:Hier steht jetzt Text, 5903, km 138,280, WHZ Schirnding ...

Anzeige einer Vertragsabweichung (BV)

1. Stammdaten
2. Angaben zur Anordnung
3. Anspruchsgrundlage
4. Bau Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung
5. Bau-Ist | Kurzbeschreibung der Vertragsabweichung
6. Zeitliche Zuordnung der vertragsabweichenden Arbeiten
7. Auswirkungen und Folgemaßnahmen
8. Kostenveränderungen
9. Bezug zu Anzeigen ←

9. Bezug zu Anzeigen

9.1 Verknüpfung

Für diesen Vorgang ist

[Neue Verknüpfung](#)

[Zurück](#)

Neue Verknüpfung erstellen

Aus der unten stehenden Liste können Sie einen bestehenden Vorgang aussuchen, mit dem Sie eine Verknüpfung erstellen wollen.

Bestehenden Vorgang suchen

Filter: Anzeige Vertragsabweichung (BV) Bedenkenanzeige (BV) Behinderungsanzeige (BV) Mehrkostenanzeige (BV)

<input type="checkbox"/>	Lfd. Nr. ↑	Vorgangstyp ↑	Bezeichnung ↑	Eingangsdatum ↓
Keine Ergebnisse zum Anzeigen gefunden				

Anzeige einer Vertragsabweichung – bisher Kostenveränderung

8. Wesentliche zusätzliche oder geänderte Leistungen sowie Darstellung von Auswirkungen auf bestehende Positionen:

Nachstehende Angaben sind entbehrlich, wenn ein Nachtrags-Leistungsverzeichnis mit Positions-, Mengen- und Preisangaben sowie der textlichen Beschreibung der Leistung beiliegt und die Mehr- und Minderkosten darin ausgewiesen sind!

Lfd. Nr.	Ggf. Positions-Nr. des LV des Hauptvertrages (z. B. die Positionen, die bei Änderung des Bauentwurfes entfallen oder geändert werden)	Kurzbeschreibung der Leistung (z. B. wie bei einer LV-Position)	Schätzung / Angabe der Menge bzw. Mengenveränderung	Kostenschätzung bzw. EP bei vorhandenen LV-Positionen des Hauptvertrages	Mehr- bzw. Minderkosten Gesamt

Anzeige einer Vertragsabweichung – bisher Anlagen/ Unterschrift

Anlagen:

- Anordnung der Leistung (Anlage zu Nr. 1)
- Kurzbeschreibung der Vertragsabweichung - ursprünglich geschuldete Leistung (Anlage zu Nr. 3)
- Kurzbeschreibung der Vertragsabweichung - Abweichung von der vertraglich geschuldeten Leistung (Anlage zu Nr. 4)
- Leistungsverzeichnis (Anlage zu Nr. 8)

Name:

Datum:

Unterschrift:

*(Signatur sperrt Eingabefelder im
Dokument bis zu dieser Seite)*

ZIB-Forum | NTPDataGO Fachforum

Anzeige einer Vertragsabweichung (alt/neu)

Anlage 2.12.1

Anzeige einer Vertragsabweichung

Datum:		Fortlaufende Nr.:	
		<small>(ggf. Systematik gem. NEuPP)</small>	
Vertragsabwickelnde Stelle (des AG):			
Titel der Anzeige der Vertragsabweichung:			
Projektbezeichnung:			
Projektnummer:		Bestell-Nr. Hauptvertrag:	
<small>(soweit bekannt)</small>			
Teilprojektnummer:		Vertragsnummer:	
<small>(soweit bekannt)</small>			
Auftragnehmer:			

1. Anordnung der Vertragsabweichung bereits erfolgt?

Nein

Ja, durch:

Detaillierte Darstellung, wer, wann, wen, wie, was angeordnet hat → siehe Anlage

2. Anspruchsgrundlage gem. VOB/B (ein Kreuz nach Überwiegendprinzip):

Änderung des Bauentwurfes (§ 2 Abs. 5)

Nicht vorgesehene Leistung (§ 2 Abs. 6)

Geänderte Pauschalpreis-Leistung (§ 2 Abs. 7)

Anzeige einer Vertragsabweichung (BV)

1. Stammdaten

2. Angaben zur Anordnung

3. Anspruchsgrundlage

4. Bau Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung

5. Bau-Ist | Kurzbeschreibung der Vertragsabweichung

6. Zeitliche Zuordnung der vertragsabweichenden Arbeiten

7. Auswirkungen und Folgemaßnahmen

8. Kostenveränderungen

9. Bezug zu Anzeigen

Keine inhaltlichen Änderungen

- Die Anzeige einer Vertragsabweichung (Anlage 2.12) wurde mit gleicher Struktur & Inhalt im neuen Formular übernommen

1. Stammdaten

1.1 Stammdaten zur Anzeige einer Vertragsabweichung ?

Laufende Nummer der Anzeige der Vertragsabweichung*

Titel der Anzeige der Vertragsabweichung*

Aktenzeichen des Auftragnehmers

1.2 Kontaktperson des Auftragnehmers ?

Anrede

Vorname

Nachname

Neue Nachtragsplattform

1. Stammdaten

DB InfraGO Nachtragsplattform | **Nachtragsmanagement** | NEuPP-Liste

VE B40 Bauvertrag | Brandmeldeanlage | 460-625-78004, Neub. Whz 2 in Altenhundem

Neuer Nachtrag (BV)

- 1. Stammdaten
- 2. Bezug zu Anzeigen
- 3. Bau-Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung
- 4. Abweichung zum Bau-Soll | Nachtragsbeschreibung
- 5. Zeitliche und örtliche Zuordnung der Nachtragsleistung
- 6. Anspruchsgrundlage und Anspruchs- voraussetzungen
- 7. Kalkulatorische Unterlagen
- 8. Upload weiterer Unterlagen

1. Stammdaten

Alle Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

1.1 Stammdaten des Nachtrags

Nachtragsnummer des Auftragnehmers*

Titel des Nachtrags*

Nettohöhe der Nachtragsforderung*

Aktenzeichen des Auftragnehmers

1.2 Kontaktperson des Auftragnehmers

Anrede

Vorname

Nachname

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

[Weiter >](#)

[←](#)

[X Abbrechen](#) [Entwurf herunterladen \(PDF\)](#) [Entwurf speichern](#) [Formular absenden](#)

Neue Nachtragsplattform

2. Bezug zu Anzeigen

DB InfraGO Nachtragsplattform Nachtragsmanagement NEuPP-Liste Role w... NUK

VE B40 Bauvertrag
Brandmeldeanlage | 460-625-78004, Neub. Whz 2 in Altenhündem

Neuer Nachtrag (BV)

- 1. Stammdaten
- 2. Bezug zu Anzeigen**
- 3. Bau-Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung
- 4. Abweichung zum Bau-Soll | Nachtragsbeschreibung
- 5. Zeitliche und örtliche Zuordnung der Nachtragsleistung
- 6. Anspruchsgrundlage und Anspruchs- voraussetzungen
- 7. Kalkulatorische Unterlagen
- 8. Upload weiterer Unterlagen

2. Bezug zu Anzeigen Alle Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

2.1 Verknüpfung des Nachtrags mit Anzeigen dieses Vertrages

Für diesen Vorgang ist bisher keine Verknüpfung vorhanden.

[Neue Verknüpfung erstellen](#)

[Zurück](#) [Weiter](#)

[Entwurf herunterladen \(PDF\)](#) [Entwurf speichern](#) [Formular absenden](#)

Neue Nachtragsplattform

2. neue Verknüpfung erstellen

DB InfraGO Nachtragsplattform | Nachtragsmanagement | NEuPP-Liste

VE B40 Bauvertrag | Brandmeldeanlage | 460-625-78004, Neub. Whz 2 in Altenhundem

Neuer Nachtrag (BV)

1. Stammdaten
2. Bezug zu Anzeigen
3. Bau-Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung
4. Abweichung zum Bau-Soll | Nachtragsbeschreibung
5. Zeitliche und örtliche Zuordnung der Nachtragsleistung
6. Anspruchsgrundlage und Anspruchs- voraussetzungen
7. Kalkulatorische Unterlagen
8. Upload weiterer Unterlagen

2. Bezug zu Anzeigen

Alle Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

2.1 Verknüpfung des Nachtrags mit Anzeigen dieses Vertrages

Für diesen Vorgang ist bisher keine Verknüpfung vorhanden.

[Neue Verknüpfung erstellen](#)

[Zurück](#) [Weiter](#)

Neue Verknüpfung erstellen

Aus der unten stehenden Liste können Sie einen bestehenden Vorgang aussuchen, mit dem Sie eine Verknüpfung erstellen wollen.

Bestehenden Vorgang suchen

Filter: Anzeige Vertragsabweichung (BV) Bedenkenanzeige (BV) Behinderungsanzeige (BV) Mehrkostenanzeige (BV)

<input type="checkbox"/>	Lfd. Nr. <small>↑</small>	Vorgangstyp <small>↑</small>	Bezeichnung <small>↑</small>	Eingangsdatum <small>↓</small>	
<input type="checkbox"/>	1	Mehrkostenanzeige (BV)	BKs_Mehrkostenanzeige_NTPneu_20260...	Di. 06.01.2026 13:04	👁
<input type="checkbox"/>	2	Behinderungsanzeige (BV)	Behinderungsanzeige_1012	Mi. 10.12.2025 13:28	👁

Neue Nachtragsplattform

3. Bau-Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung

DB InfraGO Nachtragsplattform Nachtragsmanagement NEuPP-Liste Stille... NUK

VE B40 Bauvertrag Brandmeldeanlage 460-625-78004, Neub. Whz 2 in Altenhunden

Neuer Nachtrag (BV)

- 1. Stammdaten
- 2. Bezug zu Anzeigen
- 3. Bau-Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung**
- 4. Abweichung zum Bau-Soll | Nachtragsbeschreibung
- 5. Zeitliche und örtliche Zuordnung der Nachtragsleistung
- 6. Anspruchsgrundlage und Anspruchs- voraussetzungen
- 7. Kalkulatorische Unterlagen
- 8. Upload weiterer Unterlagen

3. Bau-Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung

Alle Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

3.1 Vertragsbestandteil und exakte Fundstelle

Auswahl des Vertragsbestandteiles*

Bitte auswählen...

Beschreibung der exakten Fundstellen im ausgewählten Vertragsbestandteil*

+ Weiteren Vertragsbestandteil hinzufügen

Ergänzende Hinweise zur ursprünglich vertraglich geschuldeten Leistung

Upload ergänzender Dokumente

Dateien zum Hochladen in diesem Bereich ablegen oder

↑ Dateien auswählen

[← Zurück](#) [Weiter →](#)

[× Abbrechen](#) [Entwurf herunterladen \(PDF\)](#) [Entwurf speichern](#) [Formular absenden](#)

Neue Nachtragsplattform

4. Abweichung zum Bau-Soll | Nachtragsbeschreibung

DB InfraGO Nachtragsplattform | Nachtragsmanagement | N E u P P - L i s t e

VE B40 | Bauvertrag | Brandmeldeanlage | 460-625-78004, Neub. Whz 2 in Altenhundem

Rolle: NUK

Neuer Nachtrag (BV)

- 1. Stammdaten
- 2. Bezug zu Anzeigen
- 3. Bau-Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung
- 4. Abweichung zum Bau-Soll | Nachtragsbeschreibung**
- 5. Zeitliche und örtliche Zuordnung der Nachtragsleistung
- 6. Anspruchsgrundlage und Anspruchs- voraussetzungen
- 7. Kalkulatorische Unterlagen
- 8. Upload weiterer Unterlagen

4. Abweichung zum Bau-Soll | Nachtragsbeschreibung

Alle Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

4.1 Beschreibung der Abweichung zum Bau-Soll

Beschreibung dessen was gebaut werden soll bzw. was entgegen des Bau-Solls gebaut wurde und warum diese Leistung erforderlich ist*

Rich text editor toolbar: Bold, Italic, Underline, Link, Unlink, Bulleted list, Numbered list, Indent, Outdent, Undo, Redo.

Empty text area for description.

Upload ergänzender Dokumente zur Beschreibung der Abweichung zum Bau-Soll

Dateien zum Hochladen in diesem Bereich ablegen oder

[Dateien auswählen](#)

4.2 Nachtrags-Leistungsverzeichnis

Upload des Nachtrags-Leistungsverzeichnisses im GAEB XML Format (X86, Version 3.3)*

Dateien zum Hochladen in diesem Bereich ablegen oder

[Dateien auswählen](#)

4.3 Entfallpositionen

Upload der Dateien mit Entfallpositionen aus dem Hauptvertrag

Dateien zum Hochladen in diesem Bereich ablegen oder

[Dateien auswählen](#)

←

Abbrechen

Entwurf herunterladen (PDF) | Entwurf speichern | **Formular absenden**

Neue Nachtragsplattform

5. Zeitliche und örtliche Zuordnung der Nachtragsleistung

DB InfraGO Nachtragsplattform | Nachtragsmanagement | NEuPP-Liste

VE B40 | Bauvertrag

Brandmeldeanlage | 460-625-78004, Neub. Whz 2 in Altenhündem

Neuer Nachtrag (BV)

1. Stammdaten
2. Bezug zu Anzeigen
3. Bau-Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung
4. Abweichung zum Bau-Soll | Nachtragsbeschreibung
- 5. Zeitliche und örtliche Zuordnung der Nachtragsleistung**
6. Anspruchsgrundlage und Anspruchs- voraussetzungen
7. Kalkulatorische Unterlagen
8. Upload weiterer Unterlagen

5. Zeitliche und örtliche Zuordnung der Nachtragsleistung

Alle Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

5.1 Zeitliche Zuordnung der Nachtragsleistung

(Voraussichtlicher) Beginn der Leistungen*

(Voraussichtliches) Ende der Leistungen*

Ergänzende Hinweise zur zeitlichen Zuordnung der Nachtragsleistungen

Rich text editor with icons: bold, italic, underline, link, list, link, link, link.

Upload ergänzender Dokumente zur zeitlichen Zuordnung

Dateien zum Hochladen in diesem Bereich ablegen oder

5.2 Örtliche Zuordnung der Nachtragsleistung

Beschreibung der Örtlichkeit*

Rich text editor with icons: bold, italic, underline, link, list, link, link, link.

Upload ergänzender Dokumente zur örtlichen Zuordnung

Dateien zum Hochladen in diesem Bereich ablegen oder

Neue Nachtragsplattform

6. Anspruchsgrundlage und Anspruchsvoraussetzungen

DB InfraGO Nachtragsplattform | Nachtragsmanagement | NEuPP-Liste

VE B40 | Bauvertrag
Brandmeldeanlage | 460-625-78004, Neub. Whz 2 in Altenhündem

Neuer Nachtrag (BV)

1. Stammdaten
2. Bezug zu Anzeigen
3. Bau-Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung
4. Abweichung zum Bau-Soll | Nachtragsbeschreibung
5. Zeitliche und örtliche Zuordnung der Nachtragsleistung
- 6. Anspruchsgrundlage und Anspruchsvoraussetzungen**
7. Kalkulatorische Unterlagen
8. Upload weiterer Unterlagen

6. Anspruchsgrundlage und Anspruchsvoraussetzungen

Alle Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

6.1 Anspruchsgrundlage ?

Auswahl der Anspruchsgrundlage*

Bitte auswählen...

[Zurück](#) [Weiter](#)

←

× Abbrechen

Entwurf herunterladen (PDF) | Entwurf speichern | **Formular absenden**

Neue Nachtragsplattform

7. Kalkulatorische Unterlagen

VE B40 Bauvertrag

Brandmeldeanlage | 460-625-78004, Neub. Whz 2 in Altenhundem



Neuer Nachtrag (BV)

1. Stammdaten
2. Bezug zu Anzeigen
3. Bau-Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung
4. Abweichung zum Bau-Soll | Nachtragsbeschreibung
5. Zeitliche und örtliche Zuordnung der Nachtragsleistung
6. Anspruchsgrundlage und Anspruchs- voraussetzungen
- 7. Kalkulatorische Unterlagen**
8. Upload weiterer Unterlagen

7. Kalkulatorische Unterlagen

Alle Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

7.1 Nachtragskalkulation

Upload der Nachtragskalkulation*

Dateien zum Hochladen in diesem Bereich ablegen
oder

Dateien auswählen

7.2 Bezug Nachtragskalkulation zur Auftragskalkulation

Auswahl des Bezugs*

Bitte auswählen...

7.3 Nachunternehmer-Kalkulationen

Liegen Nachunternehmer-Kalkulationen vor?*

Bitte auswählen...

[Zurück](#)

[Weiter](#)

Neue Nachtragsplattform

8. Upload weiterer Unterlagen

DB InfraGO Nachtragsplattform Nachtragsmanagement NEuPP-Liste Bitte w. NUK

VE B40 Bauvertrag Brandmeldeanlage | 460-625-78004, Neub. Whz 2 in Altenhudem

Neuer Nachtrag (BV)

- 1. Stammdaten
- 2. Bezug zu Anzeigen
- 3. Bau-Soll | Ursprünglich vertraglich geschuldete Leistung
- 4. Abweichung zum Bau-Soll | Nachtragsbeschreibung
- 5. Zeitliche und örtliche Zuordnung der Nachtragsleistung
- 6. Anspruchsgrundlage und Anspruchs- voraussetzungen
- 7. Kalkulatorische Unterlagen
- 8. Upload weiterer Unterlagen**

Alle Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

8. Upload weiterer Unterlagen

8.1 Abrechnungsunterlagen

Liegen Abrechnungsunterlagen diese Nachtragsleistung vor?*

Bitte auswählen...

8.2 Sonstige Nachweise

Upload sonstiger Nachweise

Dateien zum Hochladen in diesem Bereich ablegen
oder

📁 Dateien auswählen

[← Zurück](#)

✕ Abbrechen 📄 Entwurf herunterladen (PDF) 💾 Entwurf speichern 📤 Formular absenden
