



Pressegespräch zur Sperrung der Sachsen- Franken-Magistrale

Baumaßnahmen zwischen Gößnitz und Zwickau
vom 17. August bis 12. Dezember 2026

6. August 2026 | Gößnitz

Foto: DB AG/Volker Emersleben

Pressegespräch zur Sperrung der Sachsen–Franken–Magistrale

6. August 2026 | Gößnitz



Ihre Gesprächspartner:



Jan Hornig	DB InfraGO Fahrweg Leiter Projektportfolio Leipzig/Chemnitz
Tobias Mocker	DB InfraGO Fahrweg Teamleiter Umbau Knoten Gößnitz Abschnitt Leipzig-Werdau
Leonhard Novak	DB Regio Südost Netzmanager S-Bahn Mitteldeutschland

Begrüßung/Moderation:

Jörg Bönisch	Pressesprecher Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
Bernd Kopp	Deutsche Bahn, Sprecher Infrastruktur

- 1. Überblick und aktualisierter Bauablauf**
2. Umbau Bahnknoten Gößnitz 2026
3. 750 m-Gleise Werdau mit Zugdeckungssignal
4. Verkehrskonzept DB Regio/S-Bahn Mitteldeutschland

Vorstellung Projektabschnitte

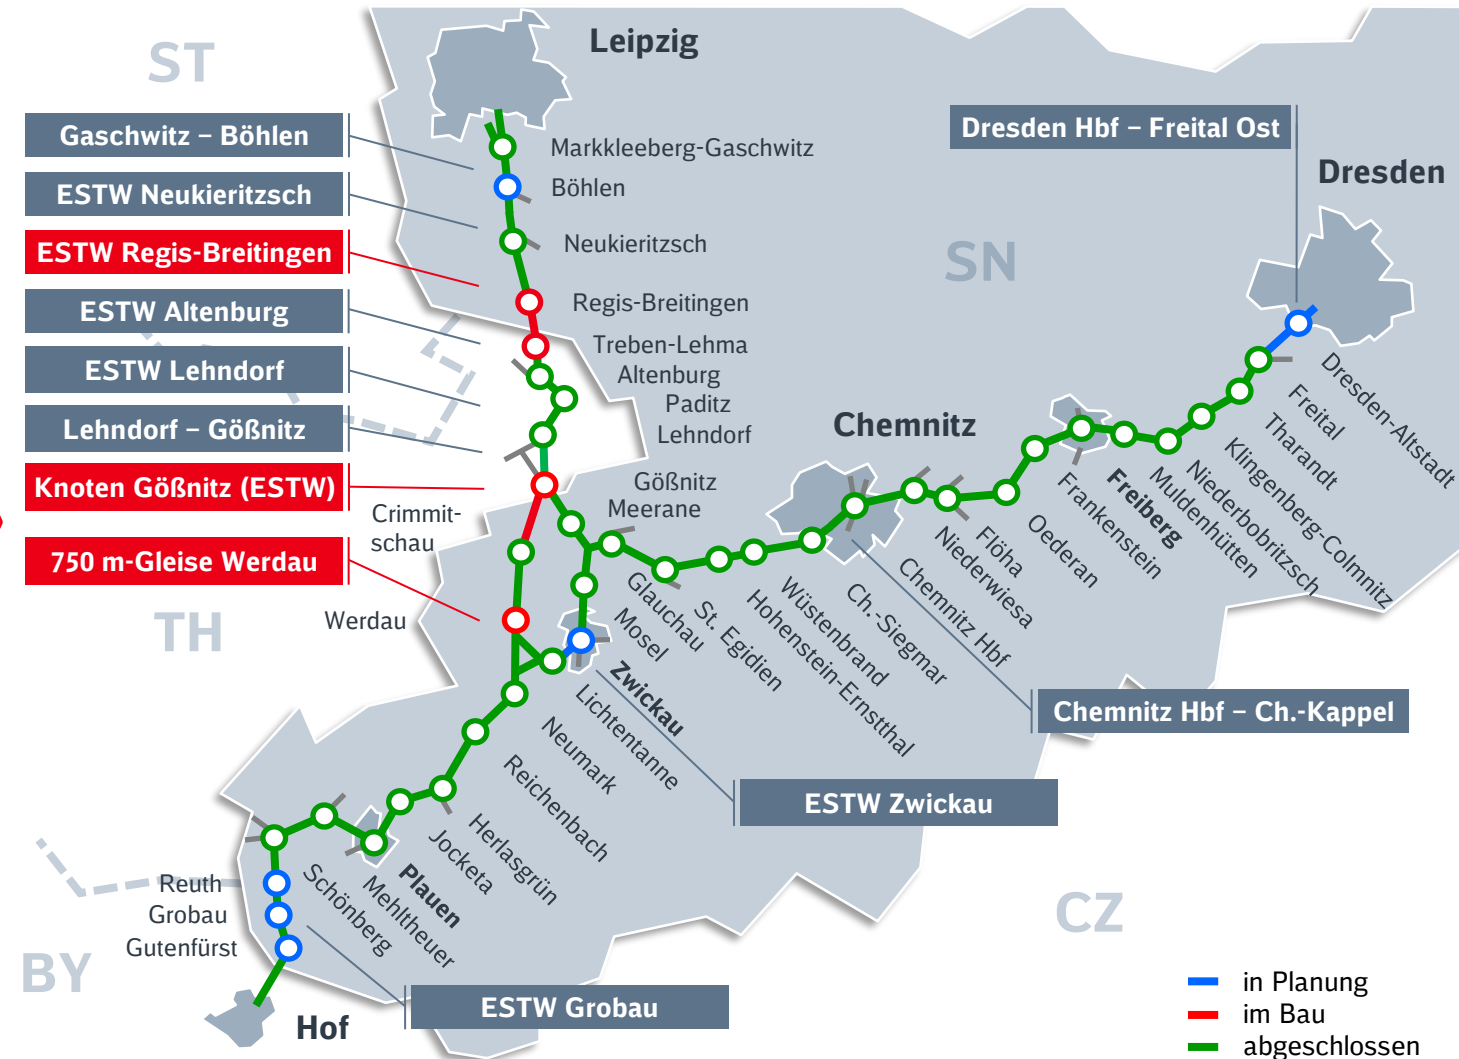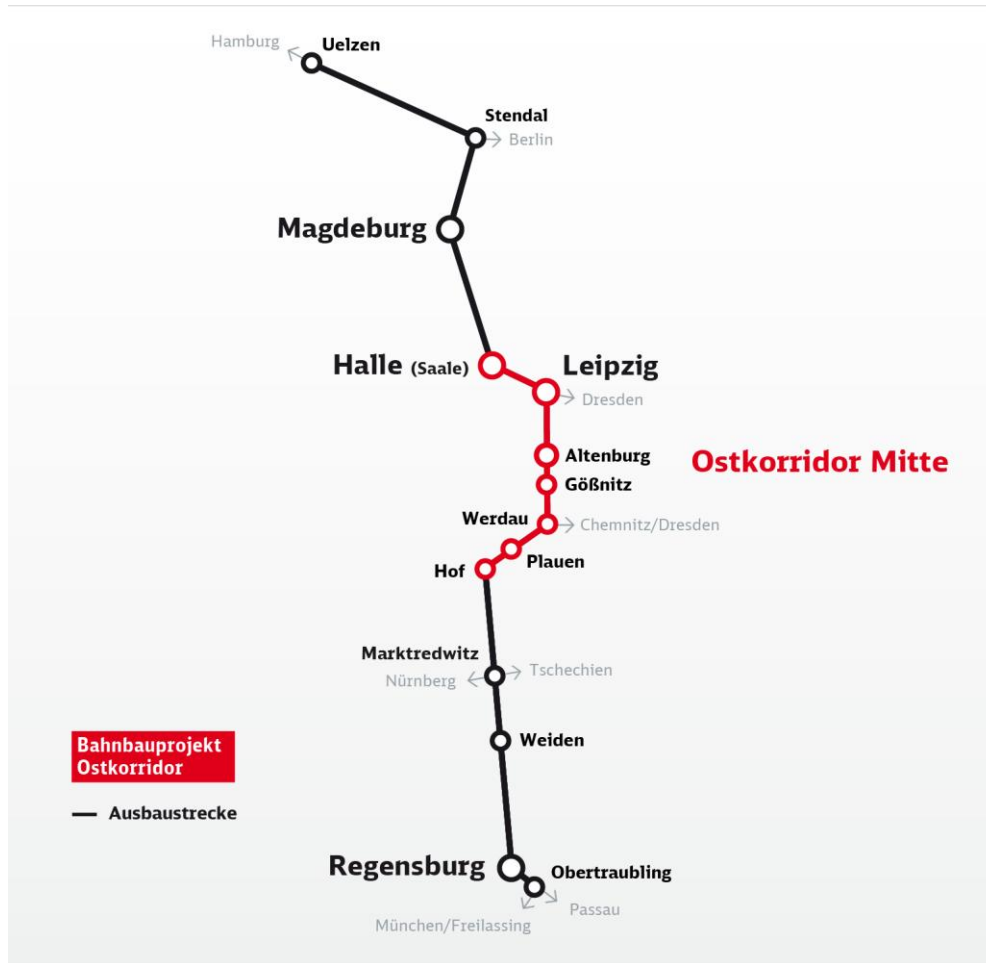

Aktualisierter Bauablauf und Inbetriebnahme-Termine



Knoten Gößnitz und Bahnhof Werdau

Es sind Anpassung des Bauablaufes im Knoten Gößnitz und Bahnhof Werdau notwendig aufgrund von:



- komplexeren Baugrundverhältnissen an den Stützwänden Alexander-Puschkin-Straße (veränderte Bautechnologie)
- Engpässen bei Fachpersonal und Materialien in der Leit- und Sicherungstechnik
- hohem Bedarf an Plan- und Abnahmeprüfer:innen durch die konzernweit gestiegene Bautätigkeit

Oktober 2026:

Ursprünglich geplante
Inbetriebnahme Werdau

2027:

Restarbeiten im Knoten Gößnitz sowie Arbeiten
an den Stützwänden Alexander-Puschkin-Straße



17. August 2026:

Start der Sperrpause



Dezember 2026:

NEU - geplante
Inbetriebnahme Werdau



Dezember 2027:

NEU – Gesamtinbetriebnahme
Knoten Gößnitz nach weiterer
Sperrpause

1. Überblick und aktualisierter Bauablauf
2. **Umbau Bahnknoten Gößnitz 2026**
3. 750 m-Gleise Werdau mit Zugdeckungssignal
4. Verkehrskonzept DB Regio/S-Bahn Mitteldeutschland

Projektabschnitt Umbau Bahnknoten Gößnitz

Aktuelle Bilder Bauabschnitt 2 – Bahnhof Gößnitz



Bahnhof Gößnitz im Juni 2026 (Fotos: DB AG/Holger Stein)



Projektabschnitt Umbau Bahnknoten Gößnitz

Aktuelle Bilder Bauabschnitt 3 und 4 – Ponitz und Crimmitschau



→ EÜ Schmöllner Straße (Foto: DB AG/Holger Stein)



→ EÜ Bahnhofstraße Ponitz (Foto: Bickhardt Bau)



→ EÜ Paradiesbach (Foto: DB AG/Holger Stein)



→ EÜ Breitscheidstraße (Foto: DB AG/Holger Stein)

Projektabschnitt Umbau Bahnknoten Gößnitz

Maßnahmen **vor** der Sperrung 22.08.2026 - 19.10.2026




Zeitraum 1 (Bauphase 7.1) So, 26.10.2025, 04:00 Uhr bis Sa, 22.08.2026, 22:00 Uhr

Bahnhof Gößnitz
ESTW-Z Altenburg
ESTW-A Gößnitz

1

- Aufbau Gleise 1-3 (einschließlich Weichen)
- Bau Stützwand Alexander-Puschkin-Straße
- Bau Lärmschutzwand
- Oberleitungsanlagen
- Streckengleis Crimmitschau - Gößnitz
- Neubau Bahnsteig 2 Haltepunkt Ponitz

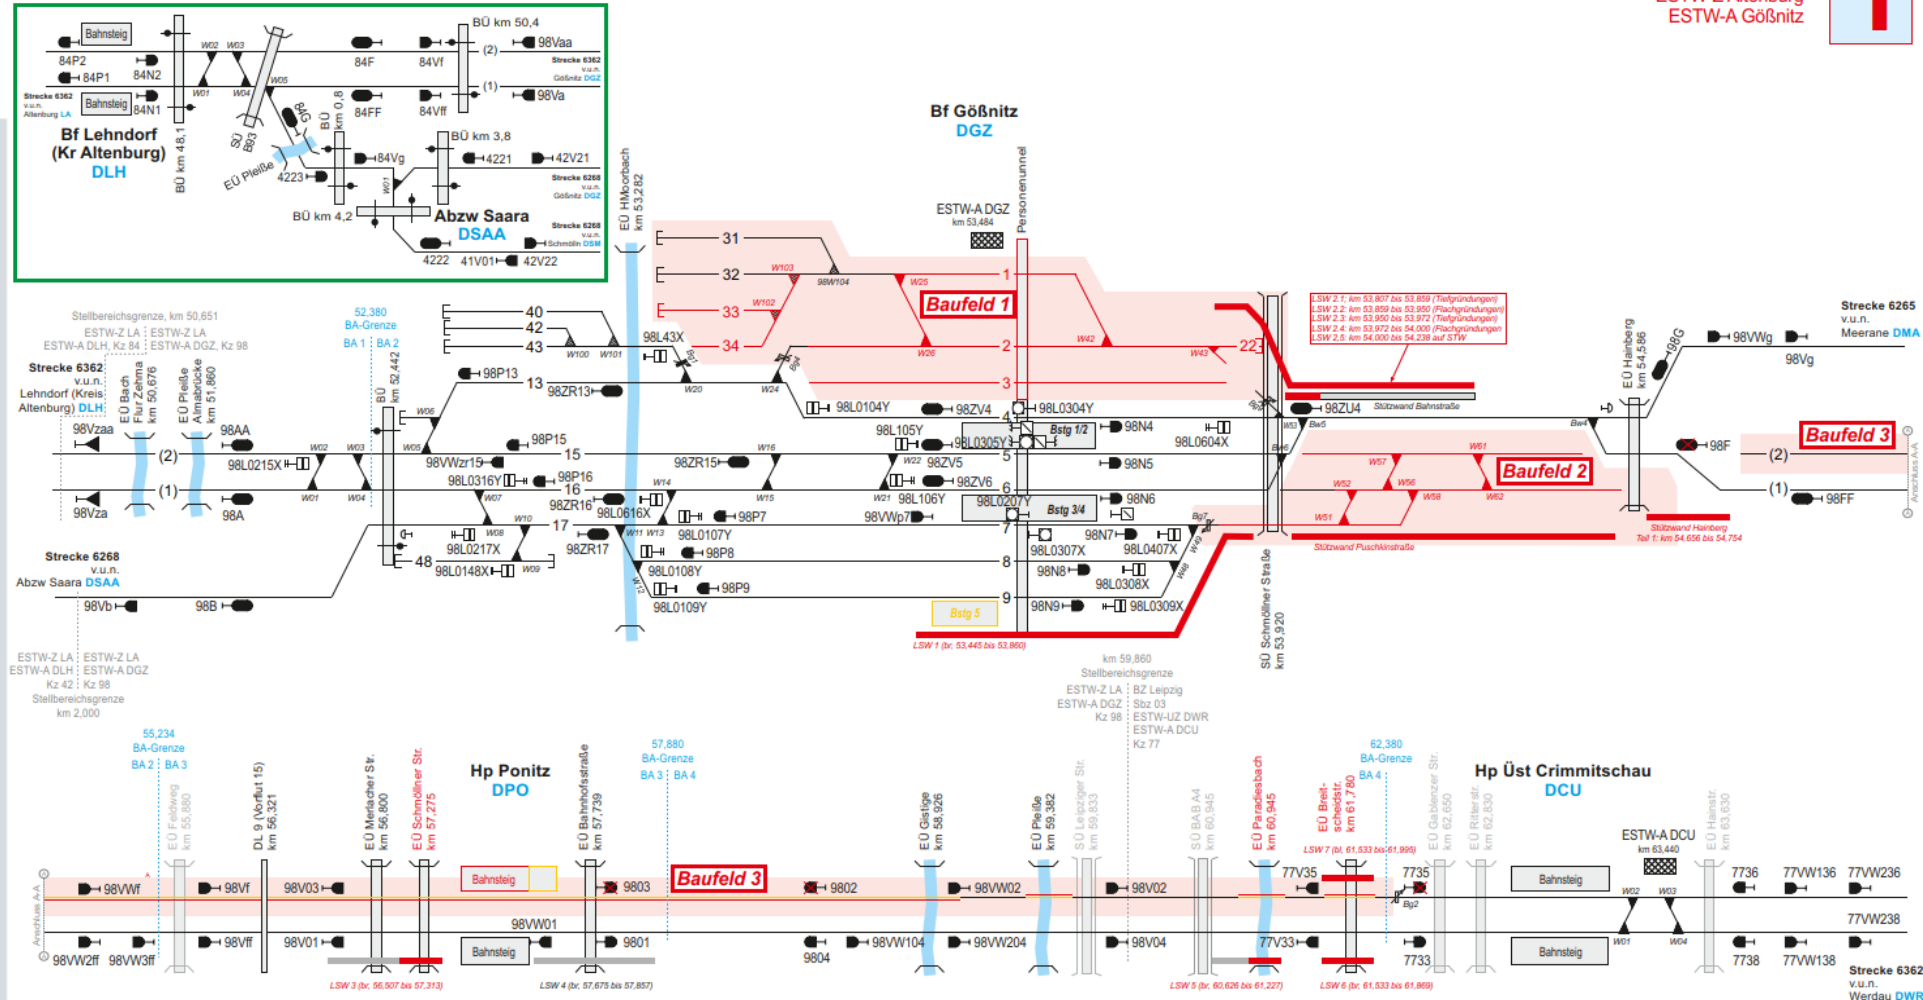

Projektabschnitt Umbau Bahnknoten Gößnitz


Maßnahmen **während** der Sperrung 22.08.2026 - 19.10.2026



Zeitraum 2 (Bauphase 7.2.0) Sa, 22.08.2026, 22:00 Uhr bis So, 19.10.2026, 04:00 Uhr

Bahnhof Gößnitz
ESTW-Z Altenburg
ESTW-A Gößnitz

2

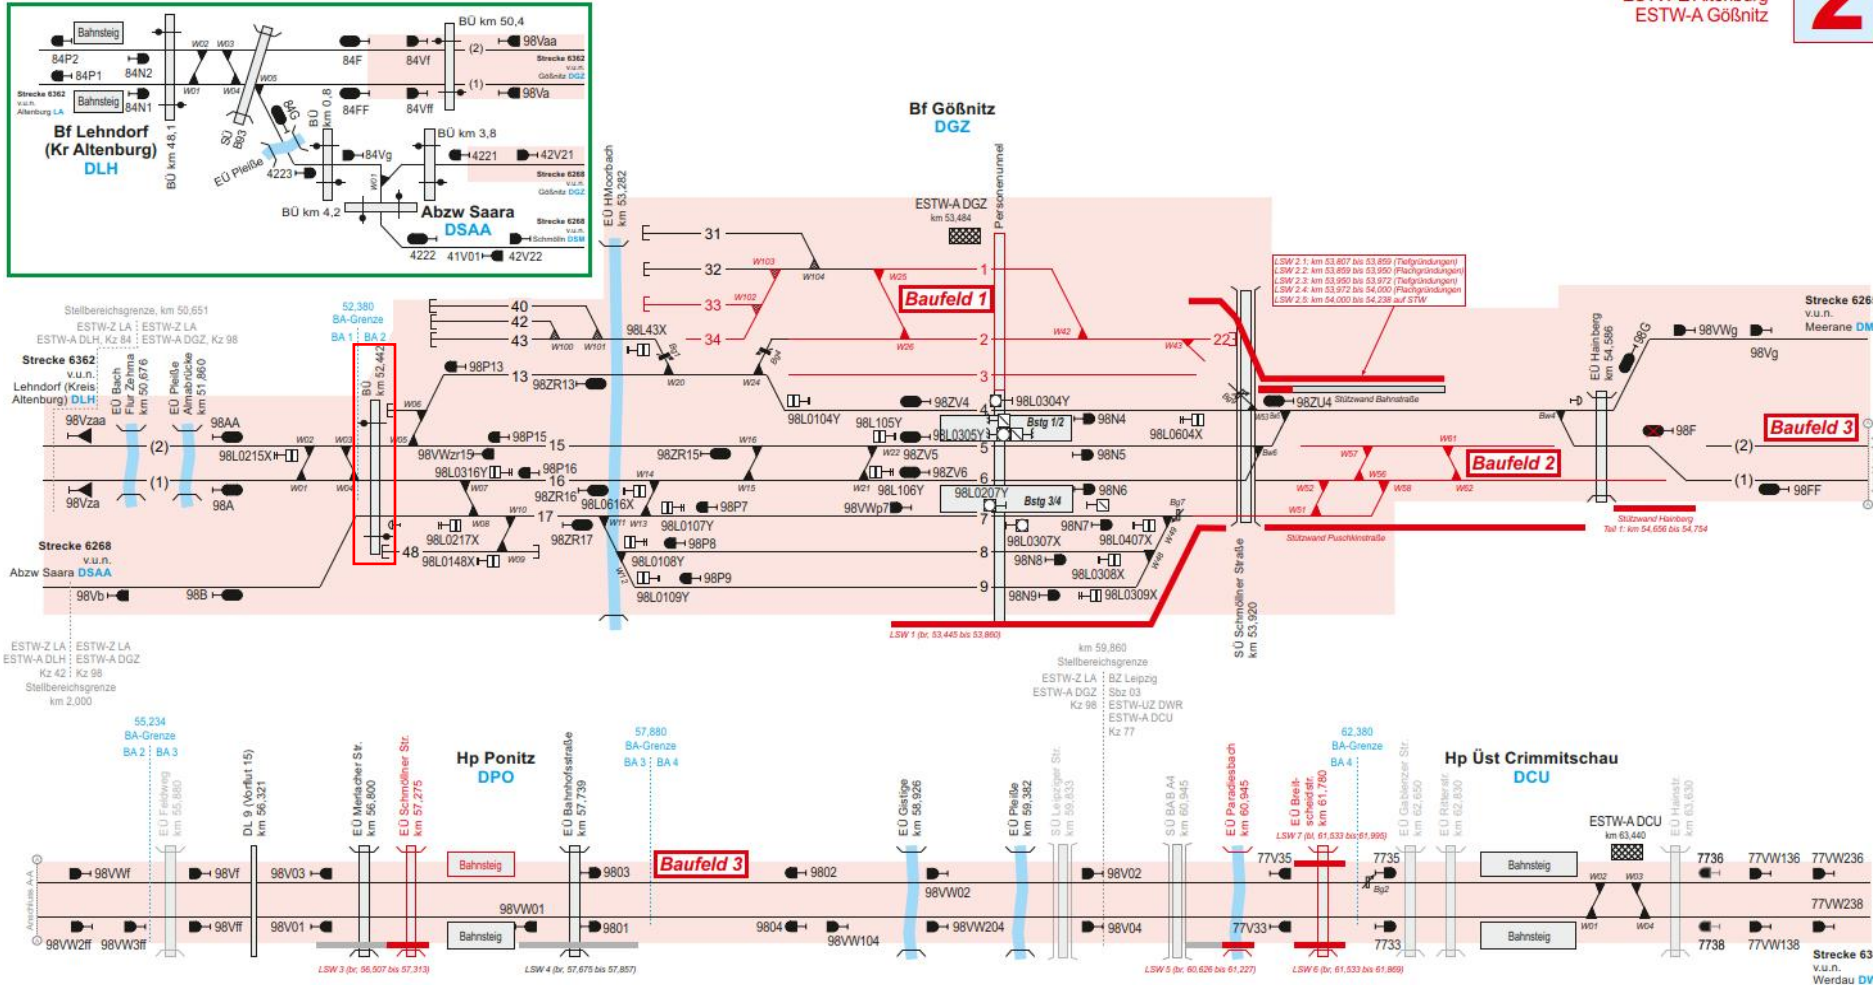

- Einschub 3 Brücken im Streckenbereich
- Aufbau Gleise 1-3 (einschließlich Weichen)
- Straßensperrung Bahnübergang Walter-Rabold-Str.
- Bau Stützwand Alexander-Puschkin-Str.
- Letzter Bauabschnitt Personenunterführung im Bahnhof Gößnitz
- Bau Lärmschutzwand
- Gleisbau im Bereich Alexander-Puschkin-Str. (einschließlich 7 Weichen)

Projektabschnitt Umbau Bahnknoten Gößnitz

Maßnahmen **nach** der Sperrung 22.08.2026 - 19.10.2026




Zeitraum 4 (Bauphase 7.2.1) So, 19.10.2026, 04:00 Uhr bis Mo, 02.08.27, 04:00 Uhr

Bahnhof Gößnitz

ESTW-Z Altenburg
ESTW-A Gößnitz

3

- Aufbau Gleise 1-3 (einschließlich Weichen)
- Anpassung Leit- und Sicherungstechnik
- Bau Stützwand Alexander-Puschkin-Str.
- Oberleitungsanlagen
- Streckengleis Crimmitschau - Gößnitz

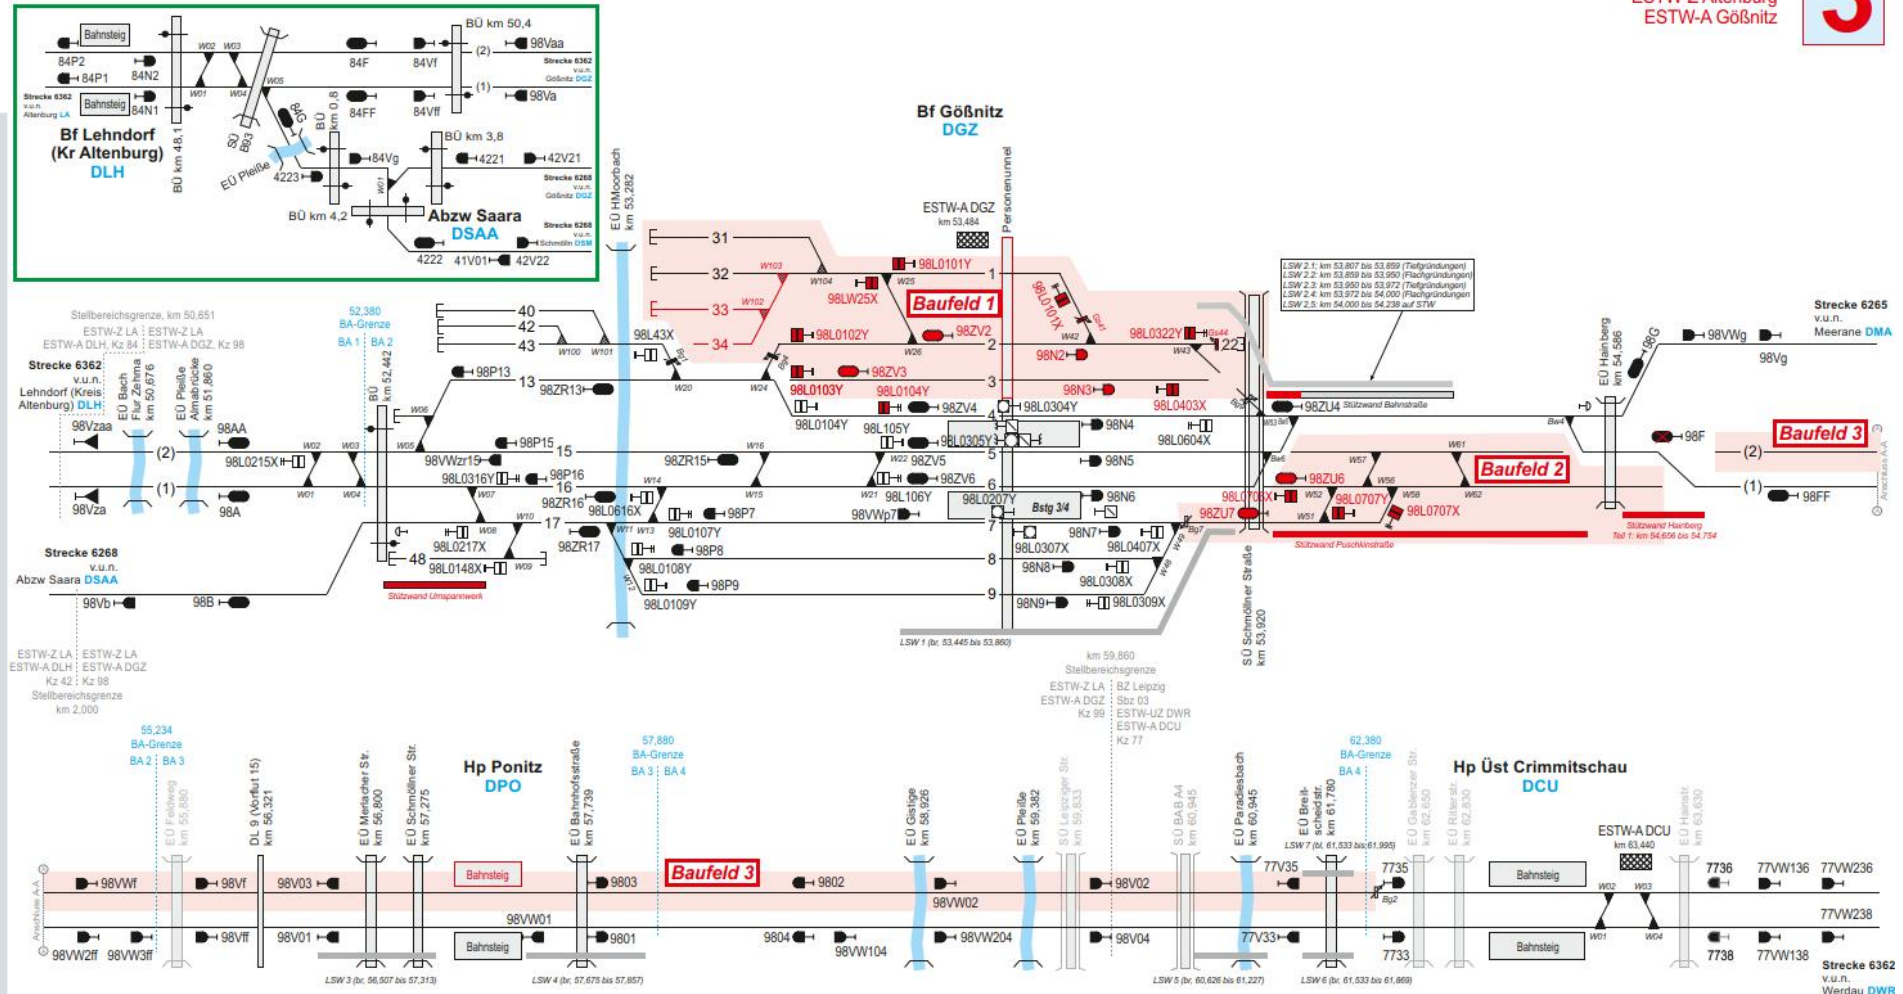


1. Überblick und aktualisierter Bauablauf
2. Umbau Bahnknoten Gößnitz 2026
3. **750 m-Gleise Werdau mit Zugdeckungssignal**
4. Verkehrskonzept DB Regio/S-Bahn Mitteldeutschland

Projektabschnitt 750m-Gleise Werdau mit Zugdeckungssignal



Projektziele:

- Verlängerung der Überholungsgleise auf 750m
- Errichtung Zugdeckungssignal auf Bahnsteig 2

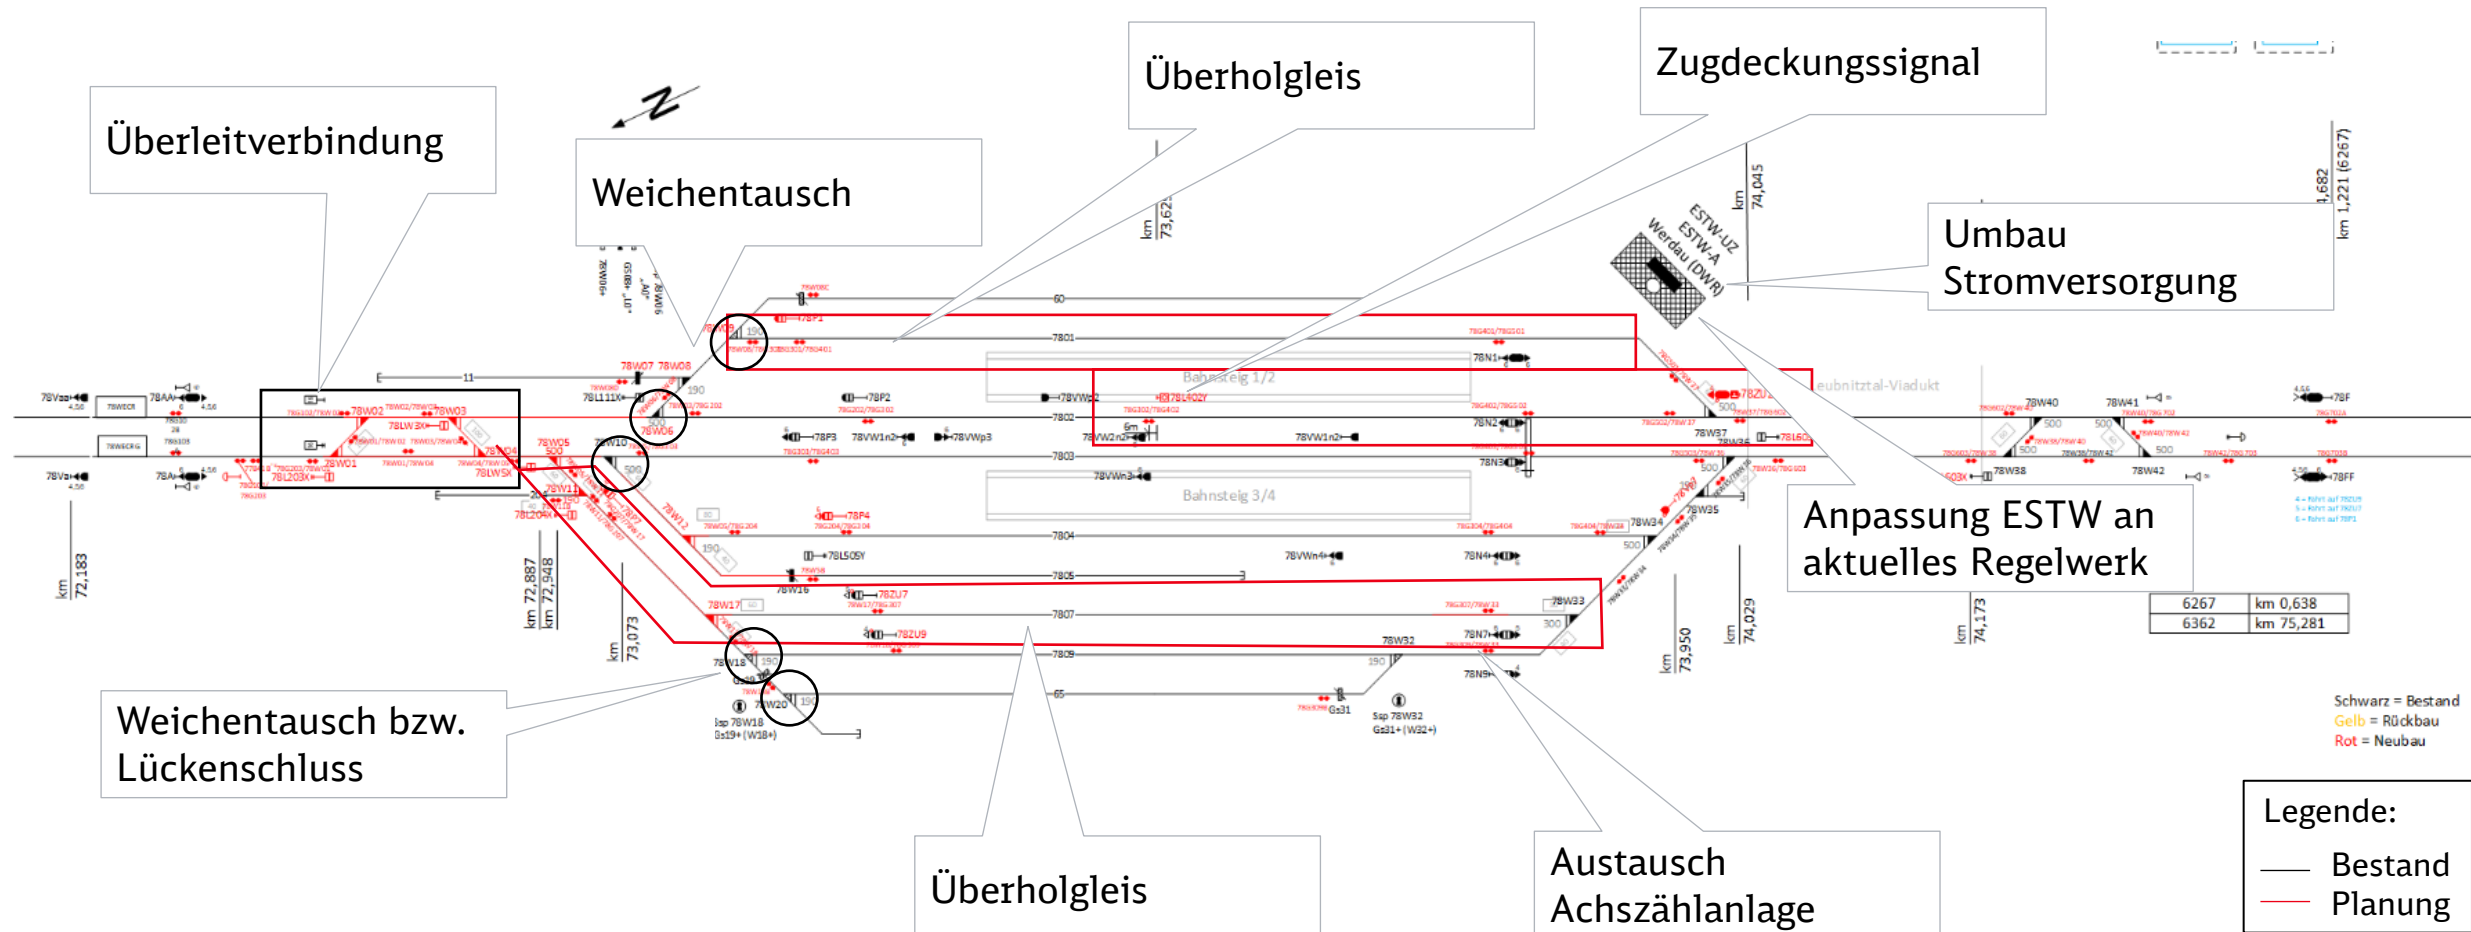

Projektabschnitt 750m-Gleise Werdau mit Zugdeckungssignal



Arbeiten während der kommenden Sperrpausen



Folgende Sperrpausen sind geplant:

– **17.08.2026 – 22.08.2026:**

Sperrung der ESTW-Unterzentrale
Werdau und Plauen

– **22.08.26 – 12.12.2026:**

Sperrung des Bahnhofs Werdau

- Herstellung von Gleisverbindungen
- Einbau neuer Weichen
- Errichtung von Kabelgefäßsystemen und Kabelverlegung
- Neubau der Weichenantriebe und Signale im Nordkopf
- Rückbau der Oberleitungsanlage und Wiederaufbau in neuer Lage
- Errichtung des Zugdeckungssignals
- Ergänzung der Bahnsteigausrüstung



Bahnhof Werdau im Juni 2026 (Fotos: DB AG/Toni Kreidemeier)

Projektstand Bahnhof Werdau

Sanierung Bahnsteigdach, Erneuerung Bahnsteigausstattung



- Bahnsteig-Dacherneuerung auf beiden Mittelbahnsteigen
 - Einbau von OLA-Gläsern
 - Abdichtung an den Glasflächen
 - Montage Unterhangfassade am Tragwerk
- Modernisierung der Ausstattung auf beiden Mittelbahnsteigen
 - Neue Windschutzhäuser und Bänke
 - Neue Vitrinen und Streugutbehälter
 - Neues Wegeleitsystem und Anzeiger DSA+
- Modernisierung der Personenunterführung und Treppenanlagen
 - Erneuerung der Wandflächen mit besonderer Fliesengestaltung
 - Farbliche Gestaltung der Personenunterführung
 - Neue Handläufe für die Treppenaufgänge
 - Überarbeitung der Beleuchtungsanlage
- Bauzeit: 22. August - 30. November 2026, Nutzungsaufnahme als Zukunftsbahnhof Ende 2026
- Bund und Deutsche Bahn investieren rund 4 Mio. Euro



Fotos/Visualisierung: DB InfraGO AG

1. Überblick und aktualisierter Bauablauf
2. Umbau Bahnknoten Gößnitz 2026
3. 750 m-Gleise Werdau mit Zugdeckungssignal
4. **Verkehrskonzept DB Regio/S-Bahn Mitteldeutschland**



Streckensperrungen zwischen Zwickau und Gößnitz/Altenburg

Ersatzverkehr DB Regio

Verkehrskonzept von 17. August bis 12. Dezember 2026

Ersatzverkehr

Altenburg/Gößnitz–Zwickau (Sachs) Hbf

17. August–12. Dezember 2026*

Letzte DB Regio S5/5X von Gößnitz nach Zwickau am
17.08.2026 – Wir sagen danke!

Die Länderbahn übernimmt ab 13.12.2026 (Fahrplanwechsel)


 **planmäßiger Zugverkehr**

 **Ersatz mit Bus 22.08. bis 19. 10. 2026**

 **Ersatz mit Bus 17.08. bis 22.08. und 19.10. bis 12.12.2026** *

*Ersatzverkehrskonzept von 19.10. bis 12.12.2026
noch in Bearbeitung (Gößnitz–Zwickau)


S5 S5X

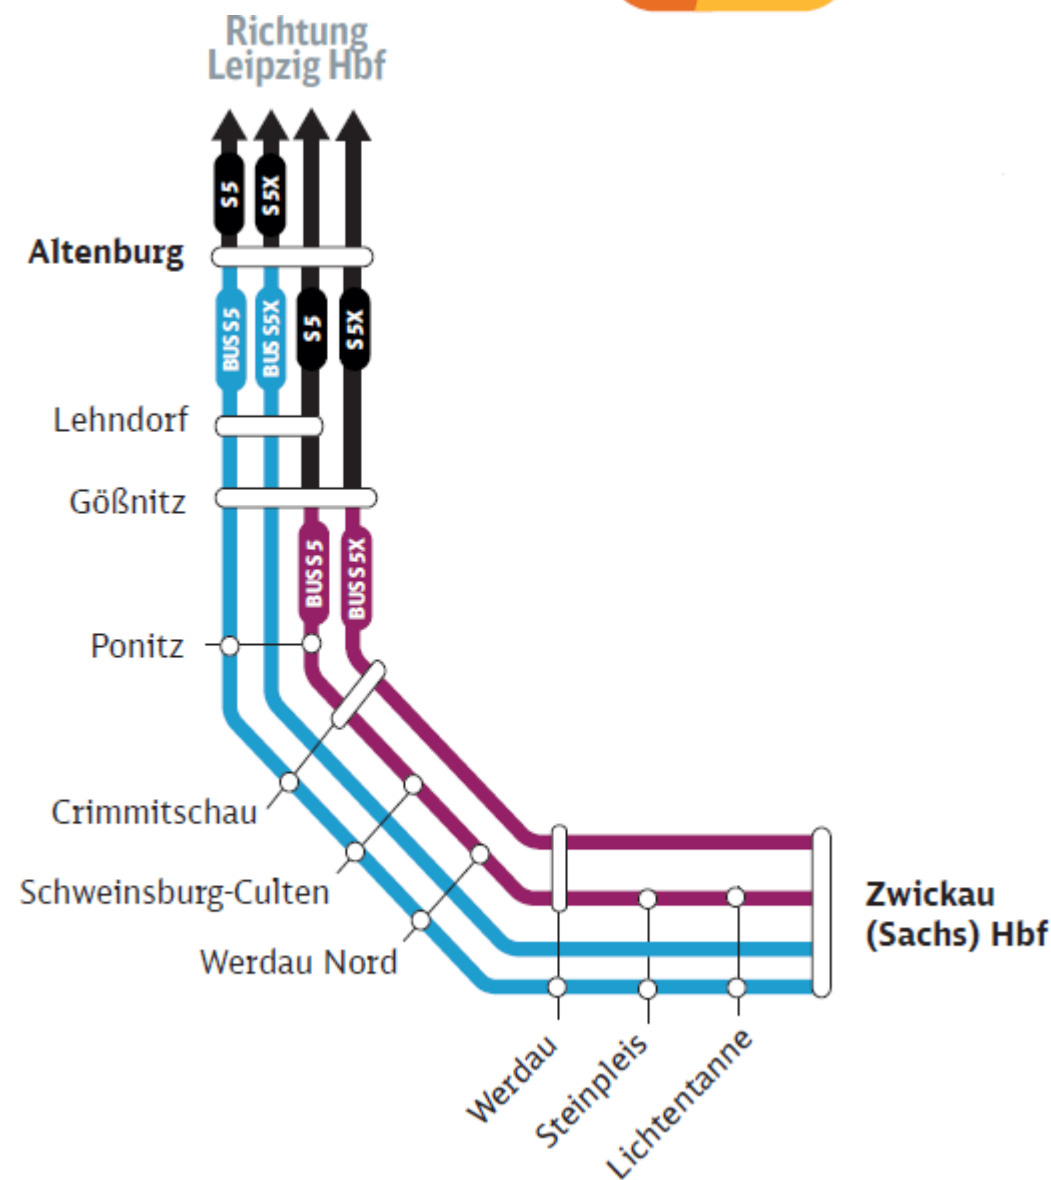

Bauarbeiten RE 1 und RE 3 Gera Hbf–Glauchau (Sachs)/Altenburg 23. August–15. November 2026



- planmäßiger Zugverkehr**
- angrenzende Strecken**
- Ersatz mit Bus nur 29.09. – 18.10.2026**
- Ersatz mit Bus nur 23.08. – 28.09.2026**
- Ersatz mit Bus nur 22.08. – 18.10.2026**

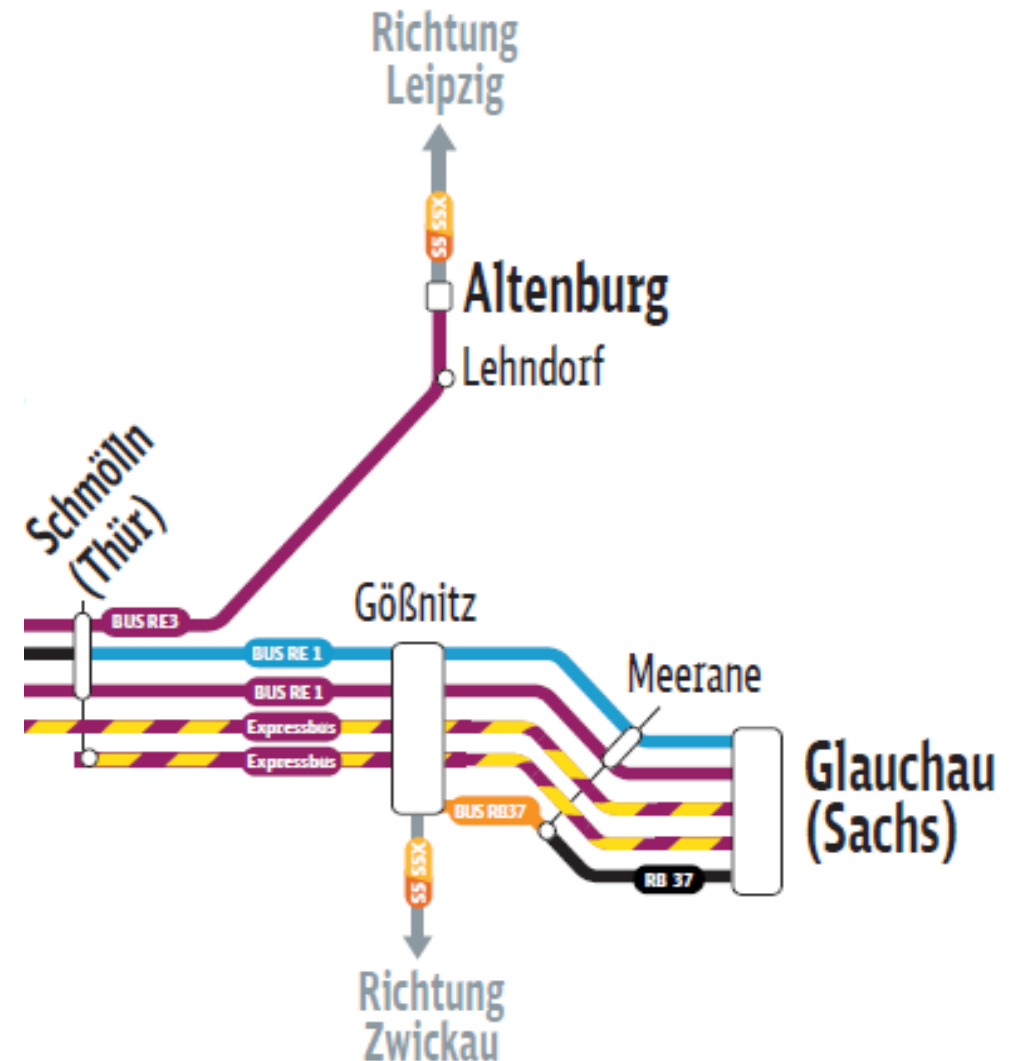

Kontaktmöglichkeiten und weitere Informationen zum Ersatzverkehr



Wir stehen Ihnen bei Fragen gern zur Verfügung!

Weitere Informationen



Unsere Verbindungsauskunft in unserer App **DB Navigator**, unter [bahn.de](https://www.bahn.de) oder am DB Automaten zeigt Ihnen wie Sie auch während der Bauarbeiten an Ihr Ziel kommen.



Weitere Informationen finden Sie auch unter [bahn.de/bauarbeiten](https://www.bahn.de/bauarbeiten)



Telefonische Auskunft
0341 26696622

Haltestellen des Ersatzverkehrs



Informationen zu den Haltestellen des Ersatzverkehrs finden Sie unter [bahn.de](https://www.bahn.de)



Infos zu den Ersatzhaltestellen auf www.bahn.de

<https://www.bahn.de>



Bahnhof wählen Service Entdecken

[bahnhof.de](https://www.bahn.de)

Q Bahnhof finden



Bahnhof wählen Service Entdecken

Neukieritzsch

is ↓ Ausstattung ↓ Service

Abfahrt / Ankunft

der nächsten abfahrenden und
enden Züge und S-Bahnen

Fahrpläne

Aushänge zu Abfahrtszeiten der Züge als
PDF

Ersatzverkehr

Lageplan als PDF

Kontaktmöglichkeiten und weitere Informationen zu Bauarbeiten



Wir stehen Ihnen bei Fragen gern zur Verfügung!

Für einen offenen und kontinuierlichen Austausch:

- **Postwurfsendungen** für betroffene Anwohnende bei Nachtarbeiten und lärmintensiven Arbeiten
- **Presseinformationen** bei wichtigen Meilensteinen und Einschränkungen für Anwohnende
- **Dialogveranstaltungen**
- regelmäßige Veröffentlichungen im **Amtsblatt**
- Projektinformationen auf unserer **Website**

Nächste Termine:

6. August 2026: Sonderöffnung Infopunkt Gößnitz

Informationszentrum Gößnitz:

Öffnungszeiten nach vorheriger Anmeldung
unter 034493 713972 oder per E-Mail

E-Mail:

sachsen-franken-magistrale@deutschebahn.com

Website:

www.sachsen-franken-magistrale.com
oder einfach QR-Code scannen





Vielen Dank

Foto: Schüßler-Plan/Stefanie Mühlbach
